GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

Livro de Transição

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano | **SEDUR**

Governo do Estado
do Rio Grande do Sul

2023-2026

Sumário

Apresentação 03

Seção I – Sedur

Contextualização do órgão 04
Organograma do órgão 05
Programas, resultados e agenda de continuidade 06

Seção II – Metroplan

Contextualização 85
Organograma 86
Programas, resultados e agenda de continuidade 87

Encerramento 94

Apresentação

Elaborado com o propósito de reunir e sistematizar informações essenciais sobre a atuação dos órgãos e entidades do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2023 a 2026, o Livro de Transição organiza referências para a transparência, a continuidade administrativa e a qualificação do processo de transição governamental.

O documento apresenta à próxima gestão um panorama objetivo da estrutura e das competências institucionais, das principais frentes de atuação, dos programas, projetos e ações desenvolvidos, dos resultados alcançados e dos temas que demandam acompanhamento e continuidade.

Ao reunir informações estratégicas sobre iniciativas em execução, orçamento, contratos, licitações, obras, riscos, prazos e decisões prioritárias, subsidia a tomada de decisão no início do próximo ciclo de gestão, com especial atenção aos primeiros 100 dias.

Constitui, ainda, instrumento de memória institucional, contribuindo para preservar o conhecimento organizacional e assegurar a continuidade das políticas públicas e dos serviços prestados à sociedade.


Seção I – SEDUR

IDENTIFICAÇÃO	
Nome e sigla	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDUR)
Site	www.sedur.rs.gov.br
Endereço	CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, 1501 - 19º andar; Ala Sul - Porto Alegre - RS, 90119-900
Base legal	Projeto de Lei Complementar nº 163/2021
Vinculadas (se houver)	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan)
Competências legais	**Apoio aos municípios:** Estímulo e assessoramento para o desenvolvimento de consórcios; Fomento à modernização da administração pública municipal e estímulo à captação de recursos; Articulação dos municípios com a administração pública estadual – projetos e parcerias; Apoio à qualificação da mobilidade e planejamento de transportes – cidades, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. **Planejamento e ordenamento das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas:** Formulação de políticas e diretrizes de ordenamento territorial para as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas – funções públicas de interesse comum; Elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado das Regiões Metropolitanas; Assessoramento à elaboração de Planos Municipais. **Governança Metropolitana e dos Aglomerados Urbanos:** Implementação e manutenção dos sistemas de governança das Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos. **Gestão Metropolitana e dos Aglomerados Urbanos:** Gestão do Sistema de Transportes Metropolitano; Gestão do Passe Livre Estudantil; Aprovação de Projetos de Parcelamento do Solo;

	Gestão de projetos, estudos e obras para prevenção contra cheias na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Número de servidores	**Total:** 126 • **Efetivos:** 14 • **Temporários:** 65 • **Cedidos para outros órgãos:** 2 • **Terceirizados:** 0 • **Comissionados:** 45
Número de estações de trabalho (presencial)	97
Concursos próprios em andamento (se houver)	**Cargo/carreira:** Fiscal de Transporte Metropolitano **Edital (nº, data e link):** 01/2025 **Número de vagas previstas:** 36 **Número de vagas autorizadas:** 36 **Próximas etapas (cronograma relevante para os 100 dias):** Repor um fiscal que solicitou desligamento

Organograma

ORGANOGRAMA SIMPLIFICADO

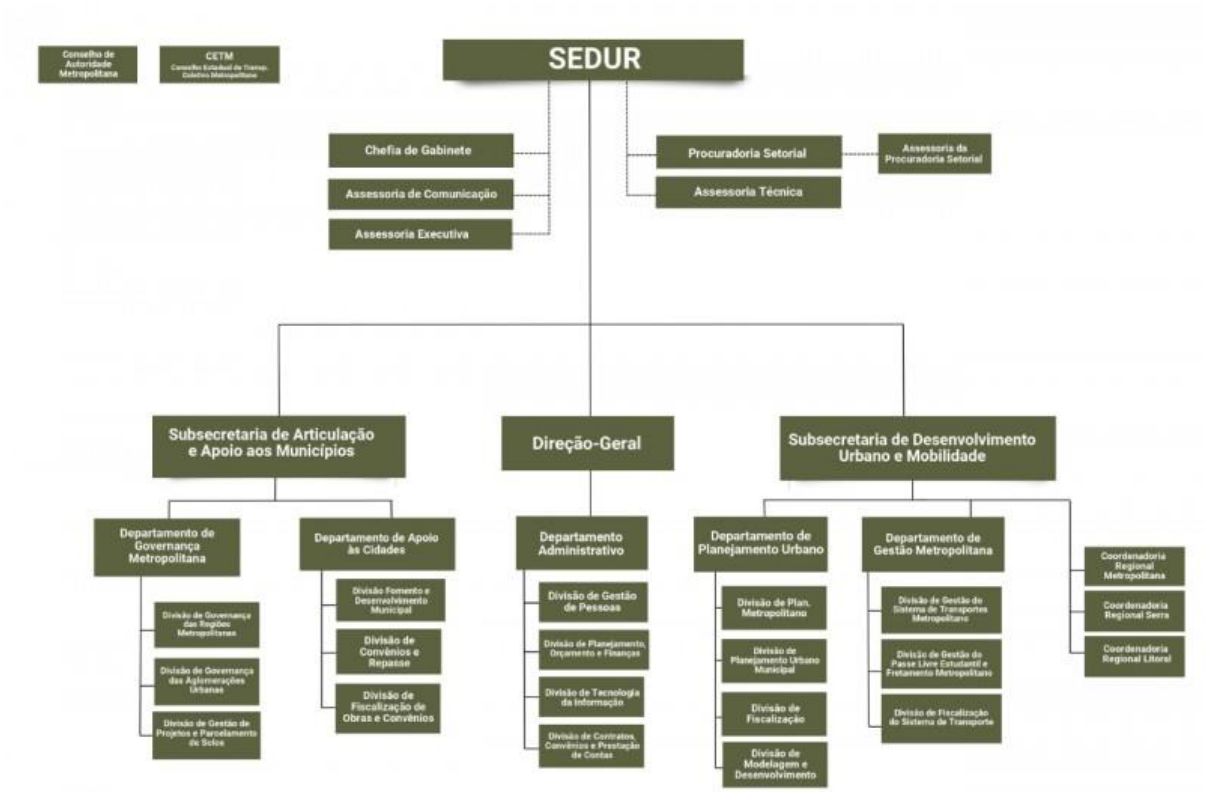

Programas, resultados e agenda de continuidade

1. Duplicação da Estrada Caminho do Meio

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Duplicação da Estrada Caminho do Meio
Base legal	Lei 14.133/2021.
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras de Porto Alegre, Alvorada e Viamão através de termo de cooperação individuais.
Objetivo	Duplicar 23,08 quilômetros de vias estruturais, formando um corredor estratégico de integração entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão.
Justificativa	A obra irá qualificar a integração entre as cidades de Porto Alegre, Alvorada e Viamão, proporcionando mais fluidez e segurança viária na trafegabilidade de pedestres e ciclistas, com a construção de faixas, paradas de ônibus, canteiro central, passeio público, ciclovias, nova iluminação e drenagem. Além disso, poderá estimular o desenvolvimento urbano e econômico, viabilizando também a qualificação do serviço de transporte público coletivo, com elevação da velocidade média do tráfego.
Principais instrumentos	Execução do estado, dividido em três trechos: Viamão, Alvorada e Porto Alegre. Os trechos de Viamão e Alvorada estão sendo executados na **modalidade semi-integrada,** projeto executivo e obra. O trecho de Porto Alegre será realizado como integrada.
Público-alvo e abrangência	A obra abrange os municípios de Porto Alegre, Viamão e Alvorada, tendo como público-alvo a população local, além de motoristas e pedestres que circulam no trecho que liga as três cidades.
Beneficiários diretos	População local - motoristas, passageiros e pedestres - que irão circular pelo corredor estratégico de integração entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** **Viamão:** Projetos finalizados, obra em execução com previsão de conclusão em abril de 2028 **Alvorada:** Contrato assinado, com início dos serviços estimados para outubro de 2026. São três meses de projeto e 12 meses de obra, com perspectiva de início das obras para janeiro de 2027

	Porto Alegre: Processo licitatório em elaboração com estimativa de 28 meses de execução.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Início das obras de Alvorada, e ordem de início do contrato do trecho de Porto Alegre.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** R$ 76.002.500,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:** R$ 56.000.000,00 **Orçamento liquidado até ago/2026:** R$ 3.988.215,20 **Orçamento LOA 2027:** R$113.000.000,00 **Fonte do recurso:** Tesouro 0001
Pontos críticos e riscos	Processo de desapropriação em andamento, que pode atrasar a execução das obras.
Recomendações	Acompanhamento junto às prefeituras para garantir celeridade nos processos de desapropriação.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Contratado	Valor	Vigência	Status
024069/2025	Trecho Viamão	Consórcio Caminho do Meio	138.500.000,00	1000 dias (18 de outubro de 2028)	Em execução
022550/2026	Trecho Alvorada	Consórcio TB-ETEL	R$ 44.295.570,00	600 dias	Em assinatura OIS

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Processo	Objeto	Fase atual	Próximas etapas
25/2600-0000280-4	Trecho Viamão	Em Execução	
25/2600-0000750-4	Trecho Alvorada	Homologada	Execução
26/2600-9000128-0	Trecho Porto Alegre	Em Elaboração	Publicação

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Valor	% executado	Status
Trecho Viamão	Estrada caminho do meio	**R$ 138.500.000**	2,75%	Em Execução

2. Plano Metropolitano de Proteção Contra Cheias

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Plano Metropolitano de Proteção Contra Cheias
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Objetivo	Garantir a segurança das populações que vivem em áreas suscetíveis à ocorrência de desastres naturais, minimizando os danos e os prejuízos decorrentes das cheias.
Justificativa	A elaboração de estudos e projetos para a proteção contra cheias é necessária diante da vulnerabilidade de municípios gaúchos aos eventos hidrológicos extremos, cujos impactos podem atingir diretamente a população, a infraestrutura urbana, os serviços públicos e as atividades econômicas. Nesse contexto, o planejamento integrado por bacias hidrográficas é fundamental para identificar áreas de risco e definir medidas estruturais e não estruturais capazes de prevenir e minimizar os efeitos das inundações.
Principais instrumentos	As propostas são desenvolvidas de forma integrada entre o Estado, as prefeituras e os consórcios técnicos responsáveis.
Público-alvo e abrangência	População residente em áreas urbanas e rurais suscetíveis a cheias e inundações, abrangendo municípios das bacias hidrográficas do Delta do Jacuí, dos rios Gravataí, dos Sinos, do Caí e Taquari-Antas, com ações e estudos integrados de prevenção e minimização dos efeitos das cheias.
Beneficiários diretos	Populações residentes nas áreas de risco dos municípios contemplados pelos estudos e projetos de proteção contra cheias. Como referência, o sistema de proteção previsto para Eldorado do Sul beneficiará diretamente uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, enquanto as ações na Bacia Taquari-Antas priorizam os municípios mais afetados pelas cheias.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [**X**] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** 1. Sistema Arroio Feijó (Alvorada/Porto Alegre) Etapa atual: contratação (pós-licitação). As 3 empresas participantes foram inicialmente desclassificadas por inconsistências documentais; após recursos, a equipe técnica acatou a habilitação do Coordenador BIM e o Consórcio SPCC – Arroio Feijó (STE, MAGNA e ENGEPLUS) foi declarado vencedor. Contrato assinado, aguardando a Ordem de Início de Serviço (OIS) — documentação solicitada à empresa em 01/07/2026. Produto final (anteprojeto atualizado) previsto para 30/05/2027. Já há também uma reunião de Plano de Trabalho em curso (agosto/2026), definindo etapas de base de dados, levantamento de campo, estudos hidrológicos, engenharia resiliente e drenagem/urbanismo.

	2. Sistema Taquari-Antas Etapa atual: contratação (habilitação concluída). O Consórcio PROFILL – ENGECORPS foi habilitado e declarado vencedor do certame (Edital 0110/2025); aguarda-se a documentação da empresa para formalização do contrato (solicitada em 20/07/2026). O projeto está dividido em duas etapas: Etapa 1 – Estudos de concepção e ambientais (32 meses, é a que está em licitação/contratação agora) e Etapa 2 – Projetos básicos e executivos de engenharia (12 meses), com ordem de início prevista para 30/09/2026 e produto final em 30/04/2029. 3. Sistema Eldorado do Sul Etapa atual: licitação da obra (RDCI). Os anteprojetos já foram finalizados e entregues (abril/2026) — única das três iniciativas licitada por critério de preço (não técnica e preço). O edital para contratação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDCI) está em elaboração na Central de Licitações, com publicação prevista para setembro, abertura em outubro e homologação em dezembro/2026. Ordem de início prevista para janeiro/2027 e obra concluída em dezembro/2030 (30 meses de execução após 6 meses de projeto/licenciamento).
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** **1. Sistema Arroio Feijó (Alvorada/Porto Alegre)** **Próximas etapas:** Emissão da Ordem de Início de Serviço (OIS), aguardando documentação da empresa (solicitada em 01/07/2026) — o cronograma indica previsão para 16/09/2026. Após a OIS, execução do Plano de Trabalho já em pauta: base de dados, levantamento de campo, estudos hidrológicos (revisão do tempo de retorno — TR, conciliando a Nota Técnica IPH 2024 com os valores regionalizados da ANA), engenharia resiliente, drenagem e urbanismo, e por fim viabilidade/risco e entrega final. Entrega do anteprojeto atualizado, prevista para 30/05/2027. Marco nos 100 dias (jan–abr/2027): o período cairá bem no meio da execução do anteprojeto (iniciado em set/2026), na fase final de "Drenagem e Urbanismo" e "Viabilidade, Risco e Entrega Final". Não há entrega formal dentro da janela, mas é o momento crítico para destravar pendências técnicas (definição do TR e integração com o dique de Porto Alegre e o RS Seguro – UMBU) antes da entrega prevista para 30/05/2027, cerca de 50 dias após o fim dos 100 dias. **2. Sistema Taquari-Antas** Próximas etapas: Formalização do contrato com o Consórcio PROFILL – ENGECORPS, pendente de documentação solicitada. Ordem de Início prevista para 30/09/2026, dando início à Etapa 1 – Estudos de Concepção e Estudos Ambientais (32 meses): 1.1 Estudos de concepção e anteprojeto de engenharia; 1.2 Estudos e relatórios de impacto ambiental. Na sequência (fora da janela de 100 dias), Etapa 2 – Projetos Básicos e Executivos de Engenharia (12 meses).

	Marco nos 100 dias (jan–abr/2027): o projeto estará entre o 4º e o 7º mês da Etapa 1 (de 32 meses), portanto em plena execução dos estudos de concepção, hidrológicos e ambientais — sem entrega formal prevista no período, mas é a fase de maior atenção quanto aos pontos críticos já sinalizados: integração com o Plano de Bacia, definição de ocupação urbana, governança entre os 119 municípios da bacia e, principalmente, o licenciamento ambiental, apontado como o maior risco por estar fora do controle direto do projeto. **3. Sistema Eldorado do Sul** Próximas etapas: Publicação do edital RDCI: setembro/2026 (previsão) → abertura em outubro/2026 → finalização do certame em dezembro/2026. **Ordem de Início prevista para Março/2027 — este é o marco que cai diretamente dentro dos primeiros 100 dias.** Início da fase de Projetos de Engenharia e Licenciamento Ambiental (6 meses), antecedendo os 30 meses de obra, com conclusão prevista para dezembro/2030.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** R$ 4.610.674,80 **Orçamento empenhado até ago/2026:** R$ 3.450.664,79 **Orçamento liquidado até ago/2026**: R$ 2.999.078,82 **Orçamento LOA 2027:** R$ 10.000,00 **Fonte do recurso:** FUNRIGS
Pontos críticos e riscos	- Arroio Feijó: pendência da assinatura da OIS e recebimento da documentação do consórcio vencedor (SPCC – STE/MAGNA/ENGEPLUS); necessidade de definição do parâmetro de tempo de retorno (TR) hidrológico, conciliando a Nota Técnica IPH 2024 (recomendação unificada para a Região Sul) com os valores regionalizados atualizados da ANA para o RS; integração técnica com o dique da Prefeitura de Porto Alegre e o programa RS Seguro – UMBU. - Taquari-Antas: formalização do contrato com o Consórcio PROFILL – ENGECORPS ainda pendente de documentação (solicitada em 20/07/2026); risco de atraso no licenciamento ambiental, apontado como o principal ponto fora do controle direto do projeto; necessidade de governança coordenada entre os 119 municípios da bacia hidrográfica. - Eldorado do Sul: aprovação da Licença de Operação (LO) junto à FEPAM; risco de insuficiência do recurso federal disponibilizado (Crédito Ordinário OGU) frente ao custo estimado do dique de R$ 531.000.000,00; assinatura do contrato RDCI e emissão da Ordem de Início previstas para janeiro/2027 — marco crítico a ser conduzido logo no início da nova gestão. - Transversal: os três sistemas dependem de etapas de licenciamento ambiental (FEPAM) como principal fator de risco a prazos, além de exigirem articulação constante entre SEDUR, SERG, municípios e consórcios técnicos contratados.

Recomendações	□ Priorizar, nos primeiros 100 dias, a emissão da OIS do Arroio Feijó e a assinatura do contrato RDCI/Ordem de Início de Eldorado do Sul, ambos marcos previstos para o 1º trimestre de 2027. □ Constituir instância de acompanhamento e governança intermunicipal para a Bacia Taquari-Antas (119 municípios) e para o Arroio Feijó (Porto Alegre/Alvorada), assegurando alinhamento entre municípios, consórcios e a nova gestão. □ Monitorar de forma proativa os processos de licenciamento ambiental junto à FEPAM nos três sistemas, antecipando pendências que possam impactar os cronogramas de anteprojeto, contratação e obra. □ Buscar fontes complementares de recursos para o Sistema Eldorado do Sul, dado que o valor federal disponibilizado (OGU) pode não ser suficiente frente ao custo estimado do dique. □ Consolidar um cronograma único de acompanhamento mensal dos três projetos (Arroio Feijó, Taquari-Antas e Eldorado do Sul) para os primeiros 100 dias, com pontos de controle e alertas antecipados de risco. □ Definir, em conjunto com a SERG, o nivelamento de informações dos sistemas Gravataí, Sinos e Caí neste mesmo Plano Metropolitano, garantindo visão consolidada de todos os sistemas de proteção contra cheias do Estado.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Contratado	Valor	Vigência	Status
022389	Atualização do anteprojeto – Arroio Feijó	Consórcio SPCC – Arroio Feijó (STE, MAGNA, ENGEPLUS)	R$ 3.450.664,79	330 a partir da OIS	Contrato assinado, aguardando OIS

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Processo	Objeto	Fase atual	Próximas etapas
Edital nº 0086/2025 (PROA 25/2600-0000392-4) – Arroio Feijó	Atualização do anteprojeto de engenharia	Certame finalizado; contrato assinado com o Consórcio SPCC (STE,	Emissão da OIS e execução do Plano de Trabalho; entrega do anteprojeto em 30/05/2027

		MAGNA, ENGEPLUS)	
Edital nº 0110/2025 (PROA 25/2600-0000731-8) – Taquari-Antas	Estudos de concepção, anteprojeto e ambientais (Etapas 1 e 2)	Consórcio PROFILL–ENGECORPS habilitado, aguardando documentação	Formalização do contrato e Ordem de Início prevista para 30/09/2026
SEI 26/2600-9000108-5 – Eldorado do Sul (RDCI)	Contratação do projeto executivo e obra	Edital em elaboração na Central de Licitações	Publicação (out/2026), abertura (nov/2026), certame

3. Parques Ecológicos Lineares

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Parques Ecológicos Lineares
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras de Muçum e Cruzeiro do Sul.
Objetivo	Implantar Parques Ecológicos Lineares nos municípios de Cruzeiro do Sul e Muçum, transformando áreas afetadas pelas enchentes em espaços destinados ao convívio da comunidade, à preservação ambiental e à valorização da memória local. A proposta busca recuperar e proteger áreas sujeitas a alagamentos, que não poderão mais ser utilizadas para moradias.
Justificativa	Os projetos têm como foco a recuperação ambiental e a requalificação urbana de regiões impactadas pelas chuvas e impactos provocados pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos anos de 2023 e, principalmente, de 2024, que resultaram em enchentes de magnitude histórica no Vale do Taquari, ocasionando destruição de edificações, perdas humanas, deslocamento populacional e severos danos à infraestrutura urbana do município de Cruzeiro do Sul. A implantação dos parques configura-se como solução urbanística, ambiental e social adequada para o território, permitindo a destinação de uma área de risco para usos compatíveis com sua dinâmica natural, por meio da criação de espaços públicos resilientes, áreas verdes inundáveis, soluções baseadas na natureza, equipamentos comunitários e estruturas adaptadas às variações hidrológicas.
Principais instrumentos	A elaboração dos projetos ficou a cargo da empresa Embyá Paisagismo, Urbanismo e Arquitetura Ltda., especializada em Soluções Baseadas na Natureza (SBN). A contratação foi

	realizada, considerando a capacidade técnica apresentada pela empresa e o compromisso com a execução dos trabalhos dentro do melhor prazo previsto.
Público-alvo e abrangência	Os projetos abrangem no município de Cruzeiro do Sul, a localidade de Passo de Estrela, uma área aproximada de 266.481,80m². Já a área localizada no município de Muçum abrange aproximadamente 28.000 m², tendo como público-alvo os moradores da região.
Beneficiários diretos	População residente nas áreas mais atingidas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos anos de 2023 e 2024 nos municípios de Cruzeiro do Sul e Muçum.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** O Parque de Cruzeiro do Sul encontra-se em execução das obras; enquanto o Parque de Muçum encontra-se em elaboração da documentação para o processo licitatório.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Parque de Passo de Estrela: conclusão estimada em 30/09/2027. Parque de Muçum: conclusão estimada em 300 dias após a emissão da ordem de início dos serviços.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** R$ 62.000.000,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:** R$ 48.594.168,00 **Orçamento liquidado até ago/2026:** R$ 0,00 **Orçamento LOA 2027:** R$ 10.002.500,00 **Fonte do recurso:** Tesouro 0001 (R$ 2.500,00), FUNRIGS 0110 (R$ 10.000.000,00)
Pontos críticos e riscos	Os principais pontos críticos referem-se à necessidade de regularização fundiária e eventual desapropriação das áreas abrangidas pelo Parque de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, considerando a existência de imóveis atingidos pelas enchentes e a necessidade de garantir a plena disponibilidade das áreas para implantação das intervenções. Eventuais pendências dominiais, indenizatórias ou de anuência dos proprietários podem impactar o cronograma de execução, a liberação das frentes de obra e a continuidade das etapas previstas. No caso de Muçum, destaca-se como risco relevante a necessidade de remoção do cemitério antigo pela Prefeitura Municipal, condição necessária para viabilizar a execução do Trecho 02 do parque. A não conclusão dessa medida em tempo hábil poderá comprometer a liberação da área, o início das obras nesse trecho e o cumprimento do cronograma previsto. Recomenda-se o acompanhamento permanente junto aos municípios, com identificação individualizada das áreas afetadas, verificação da situação jurídica dos imóveis, definição das providências administrativas relativas ao

	cemitério antigo e adoção tempestiva dos instrumentos legais necessários.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO					
Número	**Objeto**	**Contratado**	**Valor**	**Vigência**	**Status**
021686/2026	Execução de obra do Parque de Cruzeiro do Sul	CONSÓRCIO PARQUE LINEAR	48.594.168,00	600 dias	Em execução

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO			
Processo	**Objeto**	**Fase atual**	**Próximas etapas**
26/2600-9000042-9	Parque de Estrela	Execução	
26/2600-9000134-4	Parque Muçum	Elaboração	Execução

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO				
Objeto	**Localização**	**Valor**	**% executado**	**Status**
Parque de Estrela	Cruzeiro do Sul	48.594.168,00	2%	Execução

4. RS Seguro COMunidade

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	RS Seguro COMunidade
Base legal	Decreto Estadual nº 54.516, de 28 de fevereiro de 2019, alterado pelo Decreto Estadual nº 57.748, de 19 de agosto de 2024 (Programa Estruturante RS Seguro). O RS Seguro COMunidade, lançado em 15 de dezembro de 2023 como desdobramento do Eixo 2 do programa, é formalizado por Protocolo de Intenções e por Termos de Cooperação firmados com os municípios. As contratações observam a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Estadual nº 58.649, de 4 de março de 2026.
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano – DPM
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Gabinete do Governador
Objetivo	Promover a transformação urbana e social de territórios com elevados índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), por meio de intervenções de urbanismo social planejadas com a participação das comunidades. A atuação da Sedur busca qualificar espaços e equipamentos públicos, ampliar as oportunidades de convivência, lazer, esporte e cultura, fortalecer os vínculos comunitários e contribuir para a

	prevenção da violência e a melhoria da qualidade de vida da população.
Justificativa	O programa parte da compreensão de que a segurança pública também depende da qualificação dos espaços urbanos e da ampliação do acesso da população a equipamentos e políticas sociais. Territórios vulneráveis demandam intervenções integradas que considerem as necessidades dos moradores, as condições da infraestrutura urbana e a oferta de espaços públicos seguros, acessíveis e inclusivos. Nesse contexto, o urbanismo social constitui uma estratégia de prevenção à violência e de promoção do desenvolvimento local. Por meio da participação comunitária e da integração entre diferentes áreas do governo, as intervenções buscam enfrentar vulnerabilidades territoriais, fortalecer a convivência social e contribuir para a construção de ambientes urbanos mais seguros e acolhedores.
Principais instrumentos	• **Projetos Urbanísticos Integrados (PUIs):** intervenções de maior porte nos territórios prioritários de Umbu, em Alvorada, e Santa Tereza e Rubem Berta, em Porto Alegre. • **Concursos públicos de arquitetura e urbanismo:** seleção de propostas técnicas para os projetos de maior porte, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS). • **Diagnósticos territoriais e escuta comunitária:** levantamento das necessidades e percepções dos moradores para orientar as intervenções e adequá-las às características de cada localidade. • **Planejamento urbano participativo:** elaboração de soluções que integrem infraestrutura, mobilidade, acessibilidade, áreas verdes, lazer, esporte, cultura e convivência comunitária.
Público-alvo e abrangência	No eixo de atuação da Sedur, os projetos urbanísticos integrados de maior porte concentram-se em três territórios prioritários: • Umbu, em Alvorada; • Rubem Berta, em Porto Alegre; • Santa Tereza, em Porto Alegre.
Beneficiários diretos	• Famílias residentes nas áreas prioritárias, beneficiadas pela qualificação dos espaços públicos e pela ampliação da oferta de equipamentos comunitários, nos territórios de Umbu, em Alvorada; e Santa Tereza e Rubem Berta, em Porto Alegre.

	• Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que utilizam os espaços de lazer, esporte, cultura e convivência. • Organizações comunitárias e grupos locais que poderão utilizar os equipamentos para atividades coletivas, educacionais, culturais e de organização social.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** • PUI Umbu (Alvorada): obra em execução. A obra está em andamento desde a OIS de março de 2026, com prazo de 18 meses e entrega prevista para setembro de 2027. A entrega dos terrenos A e B está prevista para dezembro de 2026. A obra segue em execução na mudança de gestão e permanecerá nessa etapa até a conclusão, em 2027. • PUI Santa Tereza (Porto Alegre): processo licitatório da obra. O projeto está concluído, e o processo está em fase final de validação do orçamento e instrução para envio à Celic. • PUI Rubem Berta (Porto Alegre): processo licitatório da obra. O projeto está em fase final de análise de documentação, caderno de encargos e orçamento.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Nos primeiros 100 dias da nova gestão, a atuação do programa se concentrará em três frentes: dar continuidade à execução do PUI Umbu, concluir as licitações das obras dos PUIs Santa Tereza e Rubem Berta e iniciar essas obras. No PUI Umbu, a obra seguirá em execução, com entregas parciais previstas para o final de 2026 e conclusão prevista para 2027. Nesse período, será necessário tratar a compatibilização dos projetos estrutural e viário, com as adequações contratuais decorrentes. Nos PUIs Santa Tereza e Rubem Berta, os projetos encontram-se em fase final de análise técnica e de validação orçamentária, etapa que antecede o encaminhamento dos processos à Central de Licitações (Celic). Após a publicação dos editais e a homologação das licitações, está prevista a emissão das ordens de início de serviço entre o final de 2026 e o início de 2027. As obras terão prazo de execução de 18 meses.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026**: **Orçamento empenhado até ago/2026:** R$: 41.600.000,00

	Orçamento liquidado até ago/2026: Umbu R$ 5.324.216,34 **Orçamento LOA 2027:** 85.229.773,00 **Fonte do recurso:** Tesouro Livre
Pontos críticos e riscos	No PUI Umbu, a obra seguirá em execução, com inauguração prevista do Terreno B na segunda quinzena de dezembro de 2026, e do Terreno A na segunda quinzena de fevereiro de 2027, ambas condicionadas às condições climáticas. O primeiro aditivo contratual está em fase final de formalização. O início das obras dos Terrenos D e E depende de providências preliminares. No Terreno D, é necessário o licenciamento da área de bota-fora junto ao município, seguido da limpeza do terreno, o que indica início apenas a partir de janeiro de 2027. No Terreno E, é necessário definir a solução técnica da cobertura e da estrutura e refazer o projeto, em prazo estimado de cerca de 60 dias. Esse cenário deverá demandar novo termo aditivo no início de 2027. Riscos relevantes: Não obtenção do licenciamento das áreas de bota-fora e do Terreno C. Condições climáticas adversas, com previsão de chuvas intensas até o final do ano, que podem afetar o cronograma. Dependência da articulação com a Prefeitura para licenciamentos e demais anuências. Decisões necessárias: Definir a solução técnica da cobertura e da estrutura do Terreno E, com a formalização do novo aditivo. Rubem Berta: Assinatura da ordem de início da obra no primeiro mês do ano de 2027.
Recomendações	Recomenda-se o acompanhamento constante e o monitoramento sistemático das ações cuja execução depende dos municípios, especialmente quanto aos licenciamentos, anuências, limpeza de áreas, liberação de terrenos e demais providências necessárias à continuidade das obras e ao cumprimento dos cronogramas previstos.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Contratado	Valor	Vigência	Status
2026/020441	Execução da obra do PUI Umbu (Alvorada)	Consórcio RAAGR Umbu (Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda. e AGR Engenharia e	R$ 51.600.000,00	18 meses a partir da OIS de 24/03/2026	Em Execução

		Empreendimentos Ltda.)			
2025/020630	Projetos do PUI Santa Tereza (anteprojeto, projeto legal, projeto executivo e orçamento)	Sauermartins Arquitetos Ltda.	R$ 1.281.755,39 (contrato R$ 1.074.753,17 + aditivo de R$ 207.002,22)	12 meses a partir de 31/03/2025, com aditivos de +90 dias (a contar de 31/03/2026) e +3 meses (a contar de 28/06/2026)	Em revisão final e aprovação do projeto; 91% do contrato realizado
020162/2025	Projetos do PUI Rubem Berta (anteprojeto, projeto executivo, complementares e orçamento)	Ateliê Coletivo de Projetos Ltda.	R$ 1.215.804,29	12 meses a partir de 26/05/2025 (até 26/05/2026), com aditivo de +3 meses a contar de 26/05/2026	Em finalização; 90% do contrato realizado

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Processo	Objeto	Fase atual	Próximas etapas
26/2600-9000043-7	Obra RS Seguro Santa Tereza	Processo licitatório	Ordem de início
26/2600-9000138-7	Obra RS Seguro Rubem Berta	Instrução de Processo licitatório	Publicação do edital, ordem de início

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Valor	% executado	Status
Obra RS seguro Umbu - Alvorada	Território Umbu, em Alvorada. Terreno A – Rua Sobrado, Umbu, S/N, Alvorada; Terreno B – Rua Vereda Tropical, S/N, Umbu, Alvorada; Terreno C – Rua Doze de Julho, Umbu, S/N, Alvorada; Terreno D – Rua Tupi, S/N, Umbu, Alvorada; Terreno E – Rua Paulo Aquino	51.600.000,00	10,32 %	Em execução

	Roque, S/N, Umbu, Alvorada.			

5. Rotas de Resiliência

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Rotas de Resiliência
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.
Objetivos	Proporcionar maior segurança à população, permitindo a desocupação rápida de áreas de risco; facilitar resgates e garantir o acesso a serviços públicos durante situações de emergência; e aumentar a resiliência do Estado diante de desastres.
Justificativa	Necessidade de ampliar a segurança e a capacidade de deslocamento da população diante de situações de emergência provocadas por eventos climáticos extremos. Nesse contexto, a existência de vias municipais alternativas qualificadas é fundamental para assegurar rotas de evacuação, facilitar o atendimento e o resgate de pessoas em áreas de risco e manter o acesso a serviços públicos essenciais mesmo diante da interrupção ou comprometimento de vias principais. Assim, os investimentos em pavimentação, recapeamento e duplicação de vias estratégicas contribuem para reduzir a vulnerabilidade da infraestrutura de mobilidade, ampliar a capacidade de resposta dos municípios e fortalecer a resiliência do território.
Principais instrumentos	Por meio de convênios firmados com os municípios, o programa viabiliza intervenções que proporcionam maior segurança à população e melhores condições de circulação, especialmente durante situações de emergência.
Público-alvo e abrangência	O programa contempla 22 municípios: Bento Gonçalves, Capitão, Cotiporã, Colinas, Dois Lajeados, Encantado, Imigrante, Morro Reuter, Nova Bréscia, Nova Petrópolis, Portão, Putinga, Santa Tereza, São Jerônimo, Teutônia, Vera Cruz, Veranópolis, Relvado, Roca Sales, Serafina Corrêa, União da Serra e Westfália, tendo como público-alvo a população residente nos municípios contemplados, especialmente as pessoas que vivem ou circulam em áreas suscetíveis ao isolamento ou à interrupção de vias durante situações de emergência e eventos climáticos extremos.
Beneficiários diretos	População dos municípios contemplados pelas intervenções, beneficiada pela melhoria das condições de mobilidade e pela disponibilidade de rotas alternativas para evacuação, resgate, acesso a serviços públicos e circulação durante situações de emergência.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** Em execução do programa: 22 municípios com a primeira parcela paga.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Somente acompanhamento e pagamento das parcelas.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** 135.179.271,21 **Orçamento empenhado até ago/2026**: 129.086.966,26 **Orçamento liquidado até ago/2026**: 59.186.802,34 **Fonte do recurso**: FUNRIGS
Pontos críticos e riscos	Prazo final do FUNRIGS.
Recomendações	Acompanhar de forma sistemática a execução dos convênios celebrados no âmbito do programa, monitorando prazos, etapas de execução, prestação de contas, eventuais pendências documentais e necessidade de apoio técnico aos municípios, de modo a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas e a adequada aplicação dos recursos, especialmente em razão do prazo final de utilização dos recursos vinculados ao FUNRIGS.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Valor	Vigência	Status
78/2026	Serafina Corrêa	R$ 5.356.909,56	12 meses	Aprovado
80/2026	União da Serra	R$ 994.605,75	12 meses	Aprovado
82/2026	Santa Tereza	R$ 6.055.719,22	12 meses	Aprovado
98/2026	Imigrante	R$ 4.591.854,59	12 meses	Aprovado
86/2026	Colinas	R$ 7.748.853,33	12 meses	Aprovado
77/2026	Capitão	R$ 6.402.962,57	12 meses	Aprovado
87/2026	Cotiporã	R$ 9.966.707,03	12 meses	Aprovado
139/2026	Bento Gonçalves	R$ 5.222.412,59	12 meses	Aprovado
89/2026	Encantado	R$ 7.172.743,72	12 meses	Aprovado
50/2026	Morro Reuter	R$ 1.277.963,62	12 meses	Aprovado
75/2026	São Jerônimo	R$ 9.202.282,06	12 meses	Aprovado
96/2026	Westfália	R$ 965.041,19	12 meses	Aprovado
92/2026	Nova Bréscia	R$ 5.127.889,11	12 meses	Aprovado
93/2026	Portão	R$ 1.617.164,10	12 meses	Aprovado
110/2026	Putinga	R$ 12.000.000,00	12 meses	Aprovado

99/2026	Teutônia	R$ 3.801.529,39	12 meses	Esperando Município
100/2026	Relvado	R$ 8.600.000,00	12 meses	Aprovado
102/2026	Vera Cruz	R$ 3.580.556,83	12 meses	Esperando Município
103/2026	Roca Sales	R$ 5.492.659,96	12 meses	Aprovado
104/2026	Veranópolis	R$ 7.131.245,47	12 meses	Aprovado
106/2026	Nova Petrópolis	R$ 14.499.914,43	12 meses	Aprovado
107/2026	Dois Lajeados	R$ 2.277.951,74	12 meses	Esperando Município

O programa não possui licitação nem obra executada pelo Estado. O processo se dá por meio de convênio com repasse de valor. O município realiza a licitação e a obra.

6. Drenagem RS

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Drenagem RS
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.
Objetivo	Fortalecer tanto a infraestrutura de drenagem dos municípios do Rio Grande do Sul, quanto a sua microdrenagem, implementando soluções integradas e sustentáveis, que incluem o planejamento, construção e manutenção de sistemas de drenagem e a promoção de práticas de gestão de águas pluviais.
Justificativa	O Programa justifica-se pela necessidade de recuperar, qualificar e ampliar a infraestrutura de drenagem urbana dos municípios que tiveram seus sistemas comprometidos ou danificados pelas enchentes de 2023 e 2024. A precariedade ou insuficiência desses sistemas pode ampliar os impactos das chuvas intensas, provocando alagamentos, danos à infraestrutura urbana e transtornos à população. Nesse sentido, a iniciativa busca fortalecer a microdrenagem municipal por meio da implantação, recuperação e melhoria de estruturas de captação e condução das águas pluviais, contribuindo para o adequado escoamento da água, a redução de alagamentos e o aumento da resiliência das cidades diante de eventos climáticos extremos.
Principais instrumentos	O programa funciona por meio de Edital de Chamamento Público para Manifestação de Interesse de Adesão (PMI), cujo objeto é a avaliação e habilitação de projetos de municípios que visem viabilizar a execução de obras de drenagem em seus territórios, incluindo todas as obras necessárias para seu perfeito funcionamento, e posterior deliberação e celebração do Termo de Convênio.

Público-alvo e abrangência	Contempla municípios do Rio Grande do Sul que tiveram seus sistemas de drenagem comprometidos ou danificados pelas enchentes de 2023 e 2024 e que se enquadram nos critérios do programa, tendo, portanto, como público-alvo a população residente nos municípios contemplados pelo programa, especialmente aquela que vive em áreas urbanas sujeitas a alagamentos e problemas de drenagem.
Beneficiários diretos	População dos municípios contemplados pelo Drenagem RS, diretamente beneficiada pela recuperação e qualificação dos sistemas municipais de microdrenagem.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** Em execução do programa: 79 municípios com a primeira parcela paga.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Somente acompanhamento e pagamento das parcelas.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** 150.000.000,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:** 155.620.449,03 **Orçamento liquidado até ago/2026:** 46.159.259,12 **Fonte do recurso:** FUNRIGS
Pontos críticos e riscos	Prazo final do FUNRIGS.
Recomendações	Acompanhar de forma sistemática a execução dos convênios celebrados no âmbito do programa, monitorando prazos, etapas de execução, prestação de contas, eventuais pendências documentais e necessidade de apoio técnico aos municípios, de modo a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas e a adequada aplicação dos recursos, especialmente em razão do prazo final de utilização dos recursos vinculados ao FUNRIGS.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Valor	Vigência	Status
2223/2026	Ajuricaba	R$ 628.491,23	12 meses	17. Pago
1938/2026	Alecrim	R$ 412.607,42	12 meses	17. Pago
2212/2026	Alegria	R$ 670.297,38	12 meses	17. Pago
2011/2026	Alto Feliz	R$ 580.723,47	12 meses	17. Pago
2214/2026	Anta Gorda	R$ 504.598,33	12 meses	17. Pago
1934/2026	Arambaré	R$ 1.949.050,37	12 meses	17. Pago
2394/2026	Arvorezinha	R$ 1.461.073,31	12 meses	17. Pago
1940/2026	Balneário Pinhal	R$ 2.077.024,92	12 meses	17. Pago
2008/2026	Barra do Guarita	R$ 269.579,74	12 meses	17. Pago
1939/2026	Barão de Cotegipe	R$ 2.203.569,36	12 meses	17. Pago

2160/2026	Boa Vista do Sul	R$ 2.042.904,01	12 meses	17. Pago
2369/2026	Bom Princípio	R$ 2.497.710,08	12 meses	17. Pago
2524/2026	Bom Retiro do Sul	R$ 2.326.570,69	12 meses	17. Pago
2024/2026	Bozano	R$ 360.592,84	12 meses	17. Pago
1954/2026	Cambará do Sul	R$ 3.003.356,70	12 meses	17. Pago
2347/2026	Campo Bom	R$ 4.378.718,25	12 meses	17. Pago
2396/2026	Candiota	R$ 1.157.739,65	12 meses	13. Publicado
2087/2026	Canela	R$ 1.583.795,02	12 meses	17. Pago
2073/2026	Capitão	R$ 2.491.917,54	12 meses	16. Pagamento programado
1948/2026	Capivari do Sul	R$ 1.531.488,49	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2220/2026	Carlos Gomes	R$ 2.768.943,84	12 meses	17. Pago
2308/2026	Caseiros	R$ 828.695,50	12 meses	17. Pago
2278/2026	Colinas	R$ 772.352,98	12 meses	17. Pago
2030/2026	Cotiporã	R$ 1.806.613,01	12 meses	17. Pago
2019/2026	Cristal do Sul	R$ 1.052.020,17	12 meses	17. Pago
2191/2026	Cruz Alta	R$ 763.957,73	12 meses	17. Pago
2331/2026	Cruzaltense	R$ 2.490.673,00	12 meses	16. Pagamento programado
2145/2026	Dois Irmãos	R$ 1.137.162,69	12 meses	17. Pago
2397/2026	Dom Feliciano	R$ 2.497.568,16	12 meses	17. Pago
2370/2026	Dona Francisca	R$ 2.500.000,00	12 meses	17. Pago
2200/2026	Doutor Maurício Cardoso	R$ 972.937,41	12 meses	17. Pago
2154/2026	Doutor Ricardo	R$ 617.223,70	12 meses	17. Pago
2157/2026	Eldorado do Sul	R$ 990.896,50	12 meses	17. Pago
2010/2026	Entre-Ijuís	R$ 2.499.842,49	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2229/2026	Erval Grande	R$ 6.318.104,33	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2279/2026	Erval Seco	R$ 1.597.954,89	12 meses	17. Pago
2398/2026	Espumoso	R$ 3.378.697,43	12 meses	13. Publicado
2335/2026	Estrela	R$ 972.798,90	12 meses	17. Pago
2280/2026	Eugênio de Castro	R$ 184.589,46	12 meses	17. Pago
1944/2026	Faxinal do Soturno	R$ 2.300.768,83	12 meses	17. Pago
2288/2026	Feliz	R$ 2.139.538,15	12 meses	17. Pago
2232/2026	Flores da Cunha	R$ 4.348.789,94	12 meses	17. Pago
1962/2026	Garibaldi	R$ 1.591.004,10	12 meses	17. Pago
2204/2026	General Câmara	R$ 1.501.577,82	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2290/2026	Gravataí	R$ 2.497.439,52	12 meses	17. Pago
2624/2026	Ibirubá	R$ 1.587.847,15	12 meses	17. Pago
2206/2026	Imigrante	R$ 2.490.557,36	12 meses	17. Pago

2239/2026	Ivorá	R$ 342.192,99	12 meses	17. Pago
1961/2026	Jaguari	R$ 2.499.750,51	12 meses	17. Pago
2048/2026	Lagoa dos Três Cantos	R$ 2.111.084,27	12 meses	17. Pago
2092/2026	Linha Nova	R$ 849.798,95	12 meses	17. Pago
2161/2026	Mampituba	R$ 1.520.319,36	12 meses	17. Pago
2832/2026	Marques de Souza	R$ 356.368,98	12 meses	13. Publicado
2097/2026	Maximiliano de Almeida	R$ 2.165.837,30	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2246/2026	Morro Reuter	R$ 1.148.715,28	12 meses	17. Pago
2051/2026	Muçum	R$ 2.560.493,84	12 meses	13. Publicado
2294/2026	Nonoai	R$ 1.150.194,63	12 meses	17. Pago
1969/2026	Nova Alvorada	R$ 2.497.050,08	12 meses	17. Pago
2346/2026	Nova Prata	R$ 3.082.478,07	12 meses	17. Pago
2378/2026	Novo Barreiro	R$ 1.769.335,51	12 meses	17. Pago
2057/2026	Palmitinho	R$ 1.498.138,02	12 meses	17. Pago
2701/2026	Pantano Grande	R$ 2.994.800,01	12 meses	17. Pago
2297/2026	Passo Fundo	R$ 2.499.904,85	12 meses	17. Pago
2014/2026	Paverama	R$ 2.470.882,57	12 meses	17. Pago
2070/2026	Pedro Osório	R$ 1.144.148,88	12 meses	17. Pago
2302/2026	Pinheirinho do Vale	R$ 1.811.057,88	12 meses	17. Pago
2252/2026	Piratini	R$ 544.912,64	12 meses	17. Pago
2310/2026	Putinga	R$ 2.560.168,04	12 meses	17. Pago
2016/2026	Restinga Sêca	R$ 2.499.241,81	12 meses	17. Pago
2059/2026	Salvador das Missões	R$ 572.461,00	12 meses	17. Pago
2095/2026	Santa Maria	R$ 2.492.337,56	12 meses	17. Pago
2109/2026	Santa Tereza	R$ 2.499.719,36	12 meses	17. Pago
1981/2026	Santiago	R$ 2.331.995,72	12 meses	17. Pago
2034/2026	Serafina Corrêa	R$ 8.751.098,13	12 meses	17. Pago
2306/2026	Sinimbu	R$ 1.351.315,32	12 meses	17. Pago
2301/2026	Sobradinho	R$ 2.949.886,04	12 meses	17. Pago
2137/2026	São Jorge	R$ 1.711.688,96	12 meses	16. Pagamento programado
2118/2026	São José do Sul	R$ 473.056,22	12 meses	17. Pago
2317/2026	São João do Polêsine	R$ 2.999.947,55	12 meses	16. Pagamento programado
2318/2026	São Martinho da Serra	R$ 1.034.794,97	12 meses	17. Pago
2543/2026	São Paulo das Missões	R$ 2.398.591,66	12 meses	17. Pago
2320/2026	São Sebastião do Caí	R$ 2.486.713,46	12 meses	17. Pago
2168/2026	São Vendelino	R$ 1.014.624,38	12 meses	17. Pago
2017/2026	São Vicente do Sul	R$ 789.713,63	12 meses	17. Pago
1989/2026	Sério	R$ 156.474,27	12 meses	17. Pago
2299/2026	Tabaí	R$ 300.804,08	12 meses	17. Pago

2126/2026	Tavares	R$ 520.305,11	12 meses	17. Pago
2261/2026	Teutônia	R$ 1.377.297,31	12 meses	17. Pago
2443/2026	Três de Maio	R$ 474.090,01	12 meses	17. Pago
2071/2026	Turuçu	R$ 236.709,77	12 meses	17. Pago
2255/2026	União da Serra	R$ 698.038,33	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2132/2026	Vera Cruz	R$ 2.581.184,28	12 meses	17. Pago
2332/2026	Vespasiano Corrêa	R$ 2.212.520,57	12 meses	17. Pago
2392/2026	Vicente Dutra	R$ 1.394.761,02	12 meses	13. Publicado

O programa não possui licitação nem obra executada pelo Estado. O processo se dá por meio de convênio com repasse de valor. O município realiza a licitação e a obra.

7. Conexões RS

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Conexões RS
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.
Objetivos	Viabilizar a execução de pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas, restabelecendo conexões e criando alternativas de mobilidade em áreas afetadas; garantir o retorno da trafegabilidade; proporcionar segurança e continuidade dos serviços públicos; e apoiar o desenvolvimento econômico local.
Justificativa	O programa tem vinculação direta com o enfrentamento das consequências das enchentes de 2024, buscando o restabelecimento, a recuperação, a reconstrução ou a construção de alternativas para a infraestrutura logística e de mobilidade urbana e rural; e a resiliência climática, em especial por meio de infraestrutura e estratégias sociais, econômicas e tecnológicas para eliminação ou mitigação da vulnerabilidade climática. A interrupção ou precarização de travessias compromete a trafegabilidade, dificulta o acesso da população a serviços públicos essenciais e provoca impactos sobre as atividades econômicas locais.
Principais instrumentos	O programa funciona por meio de Edital de Chamamento Público para Manifestação de Interesse de Adesão (PMI), cujo objeto é a avaliação e habilitação de projetos de municípios que visem viabilizar a execução de obras de pontes, pontilhões, galerias e passagens molhadas em seus territórios, incluindo todas as obras necessárias para seu perfeito funcionamento, e posterior deliberação e celebração do Termo de Convênio.

Público-alvo e abrangência	Contempla municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes de 2023 e 2024, mediante parcerias entre o Estado e os municípios para execução de obras de infraestrutura de mobilidade urbana e rural, tendo como público-alvo a população residente nos municípios contemplados, especialmente aquela que depende das travessias e vias afetadas para deslocamento, acesso a serviços públicos e realização de atividades econômicas.
Beneficiários diretos	População dos municípios contemplados pelas intervenções, incluindo moradores das áreas urbanas e rurais, usuários das vias e travessias, produtores rurais, transportadores e demais pessoas que dependem da infraestrutura para circulação e acesso a serviços públicos.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** Em execução do programa: 170 municípios com a primeira parcela paga.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Somente acompanhamento e pagamento das parcelas dos convênios.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** 200.000.000,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:** 185.952.427,31 **Orçamento liquidado até ago/2026:** 60.799.593,00 **Fonte do recurso:** FUNRIGS
Pontos críticos e riscos	Prazo final do FUNRIGS.
Recomendações	Acompanhar de forma sistemática a execução dos convênios celebrados no âmbito do programa, monitorando prazos, etapas de execução, prestação de contas, eventuais pendências documentais e necessidade de apoio técnico aos municípios, de modo a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas e a adequada aplicação dos recursos, especialmente em razão do prazo final de utilização dos recursos vinculados ao FUNRIGS.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Valor	Vigência	Status
2289/2026	Aceguá	R$ 883.046,93	12 meses	17. Pago
1951/2026	Alegria	R$ 946.197,05	12 meses	17. Pago
2351/2026	Alto Feliz	R$ 627.462,37	12 meses	17. Pago
2352/2026	Amaral Ferrador	R$ 1.127.291,42	12 meses	17. Pago
1942/2026	Ametista do Sul	R$ 281.761,54	12 meses	17. Pago
2142/2026	André da Rocha	R$ 323.783,06	12 meses	17. Pago
2021/2026	Aratiba	R$ 1.089.306,44	12 meses	17. Pago
2039/2026	Arroio Grande	R$ 977.476,46	12 meses	17. Pago

1945/2026	Arroio do Meio	R$ 948.353,90	12 meses	17. Pago
2237/2026	Augusto Pestana	R$ 625.139,03	12 meses	17. Pago
2088/2026	Barra do Rio Azul	R$ 3.819.049,52	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2248/2026	Barão	R$ 1.355.627,44	12 meses	17. Pago
2086/2026	Barão de Cotegipe	R$ 330.834,87	12 meses	17. Pago
2368/2026	Barão do Triunfo	R$ 1.001.697,33	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2167/2026	Boa Vista do Incra	R$ 672.957,08	12 meses	17. Pago
2181/2026	Bom Princípio	R$ 1.207.749,05	12 meses	17. Pago
1949/2026	Bom Progresso	R$ 1.191.550,79	12 meses	17. Pago
2143/2026	Boqueirão do Leão	R$ 1.342.681,23	12 meses	17. Pago
2144/2026	Bossoroca	R$ 658.413,48	12 meses	17. Pago
2089/2026	Bozano	R$ 416.139,85	12 meses	16. Pagamento programado
2179/2026	Butiá	R$ 327.492,72	12 meses	13. Publicado
2027/2026	Cacique Doble	R$ 1.019.188,66	12 meses	17. Pago
2202/2026	Caibaté	R$ 864.750,73	12 meses	17. Pago
1970/2026	Caiçara	R$ 1.154.774,97	12 meses	17. Pago
1946/2026	Camargo	R$ 956.497,17	12 meses	17. Pago
1947/2026	Cambará do Sul	R$ 3.041.390,60	12 meses	17. Pago
2353/2026	Candiota	R$ 984.965,09	12 meses	13. Publicado
2247/2026	Canudos do Vale	R$ 3.193.608,41	12 meses	17. Pago
2000/2026	Caraá	R$ 1.805.059,46	12 meses	17. Pago
2180/2026	Carlos Gomes	R$ 904.137,77	12 meses	17. Pago
2146/2026	Catuípe	R$ 960.336,00	12 meses	17. Pago
2091/2026	Caçapava do Sul	R$ 1.188.043,57	12 meses	17. Pago
2245/2026	Cerro Branco	R$ 998.360,81	12 meses	17. Pago
2053/2026	Charrua	R$ 709.357,45	12 meses	17. Pago
1986/2026	Chiapetta	R$ 405.021,62	12 meses	17. Pago
2338/2026	Colorado	R$ 1.005.895,97	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2093/2026	Coqueiros do Sul	R$ 709.289,22	12 meses	17. Pago
2074/2026	Coronel Barros	R$ 1.181.805,37	12 meses	17. Pago
2205/2026	Cotiporã	R$ 2.453.640,35	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2207/2026	Coxilha	R$ 178.367,63	12 meses	17. Pago
2260/2026	Cruzaltense	R$ 2.332.838,00	12 meses	17. Pago
2015/2026	Cruzeiro do Sul	R$ 1.142.186,76	12 meses	17. Pago
2033/2026	Cândido Godói	R$ 1.587.664,05	12 meses	17. Pago
2166/2026	David Canabarro	R$ 1.084.693,25	12 meses	17. Pago
2001/2026	Derrubadas	R$ 648.525,13	12 meses	17. Pago
2002/2026	Dois Irmãos das Missões	R$ 894.008,75	12 meses	17. Pago

2373/2026	Dom Feliciano	R$ 1.713.941,42	12 meses	17. Pago
2026/2026	Dom Pedrito	R$ 1.100.699,42	12 meses	17. Pago
1950/2026	Encantado	R$ 3.370.066,08	12 meses	17. Pago
2208/2026	Engenho Velho	R$ 224.813,92	12 meses	16. Pagamento programado
2094/2026	Entre Rios do Sul	R$ 536.365,43	12 meses	17. Pago
2182/2026	Erebango	R$ 745.632,18	12 meses	17. Pago
2265/2026	Erval Grande	R$ 1.150.000,00	12 meses	17. Pago
2096/2026	Esperança do Sul	R$ 774.119,12	12 meses	17. Pago
2240/2026	Estação	R$ 630.090,10	12 meses	17. Pago
2209/2026	Estrela	R$ 1.343.925,07	12 meses	17. Pago
2183/2026	Estrela Velha	R$ 1.109.255,52	12 meses	17. Pago
2022/2026	Eugênio de Castro	R$ 275.958,28	12 meses	17. Pago
2291/2026	Farroupilha	R$ 779.791,32	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2158/2026	Fazenda Vilanova	R$ 416.957,56	12 meses	17. Pago
2098/2026	Feliz	R$ 993.030,25	12 meses	17. Pago
1953/2026	Floriano Peixoto	R$ 1.504.129,09	12 meses	17. Pago
2156/2026	Fortaleza dos Valos	R$ 525.580,85	12 meses	17. Pago
2375/2026	Gaurama	R$ 1.099.685,58	12 meses	17. Pago
2210/2026	Getúlio Vargas	R$ 788.246,48	12 meses	17. Pago
1955/2026	Giruá	R$ 1.343.218,91	12 meses	17. Pago
2177/2026	Glorinha	R$ 1.078.841,01	12 meses	17. Pago
2309/2026	Gramado Xavier	R$ 748.982,06	12 meses	17. Pago
2211/2026	Gravataí	R$ 1.018.504,76	12 meses	17. Pago
2213/2026	Guarani das Missões	R$ 946.919,31	12 meses	17. Pago
2215/2026	Harmonia	R$ 505.045,35	12 meses	17. Pago
2251/2026	Herval	R$ 410.299,67	12 meses	17. Pago
2100/2026	Herveiras	R$ 335.991,43	12 meses	17. Pago
2155/2026	Humaitá	R$ 998.192,69	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2371/2026	Ibiraiaras	R$ 777.887,17	12 meses	17. Pago
2243/2026	Ijuí	R$ 517.287,04	12 meses	17. Pago
1982/2026	Independência	R$ 1.498.419,99	12 meses	17. Pago
2055/2026	Inhacorá	R$ 1.078.597,61	12 meses	17. Pago
2040/2026	Iraí	R$ 1.201.394,70	12 meses	17. Pago
2257/2026	Itacurubi	R$ 499.648,11	12 meses	17. Pago
2003/2026	Itati	R$ 999.996,33	12 meses	17. Pago
2275/2026	Ivorá	R$ 452.872,82	12 meses	17. Pago
2356/2026	Jacutinga	R$ 1.127.242,41	12 meses	17. Pago
1957/2026	Jaguari	R$ 971.947,78	12 meses	17. Pago
2056/2026	Jaguarão	R$ 998.961,63	12 meses	13. Publicado

2102/2026	Jaquirana	R$ 1.109.550,20	12 meses	17. Pago
2295/2026	Jóia	R$ 1.422.959,66	12 meses	13. Publicado
2023/2026	Lagoa dos Três Cantos	R$ 1.373.763,24	12 meses	17. Pago
2004/2026	Lajeado	R$ 1.427.807,18	12 meses	17. Pago
2286/2026	Lajeado do Bugre	R$ 779.222,08	12 meses	17. Pago
2254/2026	Lavras do Sul	R$ 715.399,04	12 meses	17. Pago
1988/2026	Liberato Salzano	R$ 2.055.157,97	12 meses	17. Pago
2389/2026	Mampituba	R$ 1.000.000,00	12 meses	17. Pago
2042/2026	Maratá	R$ 657.726,84	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
1991/2026	Marau	R$ 1.305.296,75	12 meses	17. Pago
2217/2026	Mariana Pimentel	R$ 823.009,02	12 meses	17. Pago
2176/2026	Mariano Moro	R$ 479.335,44	12 meses	17. Pago
2377/2026	Mata	R$ 948.755,44	12 meses	17. Pago
2333/2026	Mato Castelhano	R$ 536.948,17	12 meses	17. Pago
2165/2026	Mato Leitão	R$ 998.947,40	12 meses	17. Pago
2379/2026	Montauri	R$ 1.347.543,49	12 meses	16. Pagamento programado
2284/2026	Mormaço	R$ 2.150.976,33	12 meses	16. Pagamento programado
2005/2026	Morrinhos do Sul	R$ 999.595,29	12 meses	17. Pago
2103/2026	Morro Redondo	R$ 796.351,84	12 meses	17. Pago
2106/2026	Mostardas	R$ 1.260.872,75	12 meses	17. Pago
2262/2026	Nicolau Vergueiro	R$ 749.264,54	12 meses	17. Pago
1959/2026	Nova Alvorada	R$ 733.354,24	12 meses	17. Pago
2359/2026	Nova Bassano	R$ 634.214,06	12 meses	17. Pago
2110/2026	Nova Esperança do Sul	R$ 533.116,11	12 meses	17. Pago
2263/2026	Nova Palma	R$ 631.884,95	12 meses	17. Pago
2113/2026	Nova Prata	R$ 1.670.846,99	12 meses	17. Pago
2285/2026	Novo Barreiro	R$ 1.111.095,91	12 meses	17. Pago
2274/2026	Novo Xingu	R$ 592.543,77	12 meses	16. Pagamento programado
2044/2026	Paim Filho	R$ 667.297,97	12 meses	17. Pago
2273/2026	Palmares do Sul	R$ 389.456,04	12 meses	17. Pago
2049/2026	Palmitinho	R$ 970.428,79	12 meses	17. Pago
2115/2026	Pantano Grande	R$ 1.029.284,87	12 meses	17. Pago
2311/2026	Paraíso do Sul	R$ 1.018.487,98	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2116/2026	Pareci Novo	R$ 429.430,63	12 meses	17. Pago
2364/2026	Passo Fundo	R$ 999.774,43	12 meses	17. Pago
2009/2026	Paulo Bento	R$ 1.161.856,87	12 meses	17. Pago
2269/2026	Pedras Altas	R$ 941.748,74	12 meses	17. Pago
2046/2026	Pedro Osório	R$ 824.336,21	12 meses	17. Pago
2153/2026	Pinhal	R$ 1.144.102,22	12 meses	17. Pago

2293/2026	Pinheirinho do Vale	R$ 1.208.577,32	12 meses	17. Pago
2162/2026	Pinto Bandeira	R$ 2.072.088,98	12 meses	17. Pago
2163/2026	Piratini	R$ 978.162,14	12 meses	17. Pago
2221/2026	Planalto	R$ 769.174,94	12 meses	17. Pago
1963/2026	Ponte Preta	R$ 3.070.062,27	12 meses	17. Pago
2151/2026	Pontão	R$ 527.057,44	12 meses	17. Pago
1994/2026	Porto Lucena	R$ 526.145,67	12 meses	17. Pago
2050/2026	Porto Mauá	R$ 3.666.865,37	12 meses	17. Pago
2117/2026	Portão	R$ 107.049,52	12 meses	17. Pago
2272/2026	Progresso	R$ 605.395,21	12 meses	17. Pago
2120/2026	Protásio Alves	R$ 2.542.343,15	12 meses	17. Pago
2122/2026	Putinga	R$ 997.607,30	12 meses	17. Pago
2222/2026	Quatro Irmãos	R$ 861.084,62	12 meses	17. Pago
2314/2026	Rio Pardo	R$ 768.406,70	12 meses	17. Pago
1964/2026	Rio dos Índios	R$ 394.422,20	12 meses	17. Pago
2127/2026	Rolador	R$ 667.669,84	12 meses	17. Pago
2006/2026	Ronda Alta	R$ 1.082.710,50	12 meses	17. Pago
2147/2026	Rondinha	R$ 3.119.418,39	12 meses	17. Pago
2224/2026	Roque Gonzales	R$ 177.774,95	12 meses	17. Pago
2124/2026	Salto do Jacuí	R$ 1.227.699,16	12 meses	17. Pago
2061/2026	Salvador das Missões	R$ 607.683,22	12 meses	17. Pago
2383/2026	Salvador do Sul	R$ 1.218.203,18	12 meses	17. Pago
2128/2026	Santa Clara do Sul	R$ 1.385.163,50	12 meses	17. Pago
1966/2026	Santa Margarida do Sul	R$ 591.812,00	12 meses	17. Pago
2129/2026	Santa Maria	R$ 999.530,67	12 meses	17. Pago
2013/2026	Santa Rosa	R$ 1.135.676,51	12 meses	17. Pago
2360/2026	Santo Antônio da Patrulha	R$ 860.689,73	12 meses	17. Pago
2174/2026	Santo Antônio do Palma	R$ 1.312.089,86	12 meses	17. Pago
2196/2026	Santo Cristo	R$ 713.508,12	12 meses	17. Pago
2175/2026	Sarandi	R$ 1.190.693,45	12 meses	17. Pago
2138/2026	Seberi	R$ 954.105,00	12 meses	17. Pago
2228/2026	Senador Salgado Filho	R$ 505.257,18	12 meses	17. Pago
2139/2026	Serafina Corrêa	R$ 1.012.191,84	12 meses	17. Pago
2075/2026	São Francisco de Assis	R$ 999.226,62	12 meses	17. Pago
2391/2026	São José das Missões	R$ 1.561.278,72	12 meses	17. Pago
2149/2026	São José do Inhacorá	R$ 418.567,75	12 meses	17. Pago
2267/2026	São José do Sul	R$ 445.913,99	12 meses	17. Pago

1995/2026	São Martinho	R$ 788.530,64	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2133/2026	São Martinho da Serra	R$ 511.830,64	12 meses	17. Pago
2134/2026	São Miguel das Missões	R$ 529.224,59	12 meses	17. Pago
2135/2026	São Pedro das Missões	R$ 999.113,27	12 meses	17. Pago
2136/2026	São Vendelino	R$ 923.168,98	12 meses	17. Pago
1997/2026	São Vicente do Sul	R$ 814.679,55	12 meses	17. Pago
2020/2026	Tapera	R$ 474.308,76	12 meses	13. Publicado
2052/2026	Taquari	R$ 1.084.438,02	12 meses	17. Pago
2337/2026	Tenente Portela	R$ 1.204.066,04	12 meses	17. Pago
2434/2026	Teutônia	R$ 1.805.998,28	12 meses	17. Pago
2384/2026	Tio Hugo	R$ 835.480,79	12 meses	16. Pagamento programado
2393/2026	Toropi	R$ 956.969,63	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2287/2026	Travesseiro	R$ 392.275,74	12 meses	17. Pago
2387/2026	Trindade do Sul	R$ 985.875,23	12 meses	13. Publicado
2188/2026	Três Arroios	R$ 899.319,47	12 meses	17. Pago
2312/2026	Três Forquilhas	R$ 899.130,79	12 meses	15. CAGE - Atender pagamento
2140/2026	Três Palmeiras	R$ 1.177.894,02	12 meses	17. Pago
2355/2026	Três Passos	R$ 914.549,44	12 meses	17. Pago
2230/2026	Três de Maio	R$ 818.169,72	12 meses	17. Pago
2007/2026	Ubiretama	R$ 1.166.698,75	12 meses	17. Pago
2283/2026	União da Serra	R$ 1.382.627,60	12 meses	14.2 DAC - Anexar lista de verificação 1ª parcela
2233/2026	Vale Real	R$ 1.230.370,89	12 meses	17. Pago
2184/2026	Vanini	R$ 751.846,54	12 meses	17. Pago
2172/2026	Vera Cruz	R$ 940.121,10	12 meses	17. Pago
2242/2026	Viadutos	R$ 764.835,93	12 meses	17. Pago
2435/2026	Vicente Dutra	R$ 1.432.539,06	12 meses	17. Pago
1967/2026	Vila Maria	R$ 2.604.402,79	12 meses	17. Pago
2441/2026	Vila Nova do Sul	R$ 254.213,29	12 meses	17. Pago
2197/2026	Vista Alegre	R$ 1.563.604,37	12 meses	17. Pago
2266/2026	Vista Alegre do Prata	R$ 1.996.052,57	12 meses	17. Pago
2199/2026	Vitória das Missões	R$ 480.860,87	12 meses	17. Pago
2201/2026	Westfália	R$ 893.241,38	12 meses	17. Pago
2253/2026	Áurea	R$ 444.391,45	12 meses	17. Pago

8. Contenções

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Contenções
Unidade responsável	Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano (DPM).
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.
Objetivos	Apoiar os municípios atingidos pelas cheias de 2024 na execução de obras de contenção e contribuir para a recuperação e a redução da vulnerabilidade de áreas afetadas pelas cheias.
Justificativa	Necessidade de apoiar a recuperação dos municípios atingidos pelas cheias de 2024 e de reduzir a vulnerabilidade de áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos. A iniciativa integra as ações do Plano Rio Grande voltadas à reconstrução e à resiliência dos municípios atingidos pelas enchentes, contribuindo para a proteção das áreas afetadas e para a redução dos riscos associados a futuros eventos climáticos extremos.
Principais instrumentos	Por meio de convênios com os municípios, o Governo do Estado busca viabilizar obras de contenção como medida de recuperação e de fortalecimento da infraestrutura local.
Público-alvo e abrangência	Contempla municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas cheias de 2024, tendo como público-alvo a população localizada nas áreas que demandam intervenções de contenção. Atualmente, possuem documentação completa aprovada os municípios de Arambaré, Charrua, Cotiporã, Feliz, Itati, Jaguarão, Mata, Nova Palma, Santa Maria, Santa Tereza, São Jorge, Vale Real e Vespasiano Corrêa.
Beneficiários diretos	População dos municípios contemplados pelas obras de contenção.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [x] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** Em execução do programa: 01 município com a primeira parcela paga.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Acompanhamento e pagamento das parcelas.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** 90.028.830,97 **Orçamento empenhado até ago/2026:**75.843.961,71 **Orçamento liquidado até ago/2026:** 15.481.645,42 **Fonte do recurso:** FUNRIGS

Pontos críticos e riscos	Prazo final do FUNRIGS
Recomendações	Acompanhar de forma sistemática a execução dos convênios celebrados no âmbito do programa, monitorando prazos, etapas de execução, prestação de contas, eventuais pendências documentais e necessidade de apoio técnico aos municípios, de modo a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas e a adequada aplicação dos recursos, especialmente em razão do prazo final de utilização dos recursos vinculados ao FUNRIGS.

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO				
Número	**Objeto**	**Valor**	**Vigência**	**Status**
2653/2026	Arambaré	R$ 1.060.111,13	12 meses	16. Pagamento programado
2657/2026	Charrua	R$ 2.436.671,09	12 meses	16. Pagamento programado
2658/2026	Cotiporã	R$ 2.945.652,79	12 meses	17. Pago
2660/2026	Feliz	R$ 18.286.659,61	12 meses	16. Pagamento programado
2661/2026	Itati	R$ 5.854.663,33	12 meses	16. Pagamento programado
2664/2026	Jaguarão	R$ 3.265.561,38	12 meses	13. Publicado
2666/2026	Mata	R$ 15.136.226,10	12 meses	16. Pagamento programado
2667/2026	Nova Palma	R$ 14.965.966,96	12 meses	13. Publicado
2670/2026	Santa Tereza	R$ 6.190.641,42	12 meses	13. Publicado
2665/2026	São Jorge	R$ 724.952,27	12 meses	16. Pagamento programado
2748/2026	Vale Real	R$ 2.542.145,58	12 meses	13. Publicado

O programa não possui licitação nem obra executada pelo Estado. O processo se dá por meio de convênio com repasse de valor. O município realiza a licitação e a obra.

9. Desassorear RS

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Programa Desassorear RS
Base legal	Lei Estadual nº 16.134/2024 (Plano Rio Grande e FUNRIGS); Decreto Estadual nº 57.647/2024; Resolução nº 04/2024 do

	Comitê Gestor do Plano Rio Grande; Lei Federal nº 14.133/2021.
Unidade responsável	Departamento de Apoio às Cidades - DAC
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedur, em articulação com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura - Sema, e os municípios participantes. O programa integra as ações do Plano Rio Grande.
Objetivos	• Promover o desassoreamento, limpeza e desobstrução de arroios, canais de drenagem, córregos, rios e sistemas pluviais em municípios atingidos por eventos climáticos extremos, especialmente aqueles que declararam situação de emergência ou estado de calamidade. • Reduzir os riscos de novos alagamentos e transbordamentos, além de melhorar a capacidade de escoamento dos cursos d'água e sistemas de drenagem, contribuindo para a segurança, estabilidade e resiliência dos municípios gaúchos diante de eventos climáticos extremos.
Justificativa	O Programa Desassorear RS foi instituído em razão dos impactos provocados pelos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente as enchentes de 2024, que ocasionaram o acúmulo de sedimentos e resíduos em arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais. O desassoreamento é necessário para recuperar a capacidade de escoamento desses sistemas, reduzir riscos de alagamentos e contribuir para a prevenção e mitigação dos impactos de novos eventos climáticos, apoiando a reconstrução e a resiliência dos municípios atingidos.
Principais instrumentos	• Termo de Referência – Desassoreamento RS; • Contrato com o Consórcio Desassoreamento RS; • Termos de Cooperação Técnica com os municípios; • Ordens de Serviço; • Projetos e planos de trabalho apresentados pelos municípios; • Medições e relatórios de execução físico-financeira; • Fiscalização e acompanhamento técnico pela Sedur e pelos municípios; • Sistema FPE e processos administrativos (PROA) para acompanhamento da execução.
Público-alvo e abrangência	Municípios do Rio Grande do Sul atingidos por eventos climáticos extremos, com prioridade para aqueles em situação de emergência ou calamidade, abrangendo as diferentes regiões do Estado

Beneficiários diretos	Municípios atingidos pelos eventos climáticos, especialmente as populações residentes em áreas sujeitas a alagamentos e inundações, beneficiadas pela recuperação da capacidade de escoamento de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O Programa Desassorear RS já contemplou 226 municípios no Eixo 1, voltado a pequenos rios, arroios e canais de drenagem. Até outubro de 2026, haviam sido retirados 4.700.929,21 m³ de sedimentos, com intervenções já iniciadas em diversos municípios, contribuindo para a recuperação da capacidade de escoamento dos cursos d'água e para a redução dos riscos de alagamentos. Planos de Ordem e Execução

O programa conta com R$ 300 milhões do FUNRIGS e integra a carteira de investimentos do Plano Rio Grande. planoriogrande.rs.gov.br

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [x] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** O Programa Desassorear RS encontra-se em execução, com realização dos serviços de desassoreamento e limpeza de arroios, canais de drenagem e cursos d'água nos municípios contemplados. A etapa envolve a execução dos serviços, fiscalização, medições, acompanhamento físico-financeiro e processamento das respectivas despesas. A continuidade dependerá do cumprimento dos cronogramas e das obrigações contratuais e administrativas vigentes.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Dar continuidade à execução e fiscalização dos serviços, com prioridade para a conclusão das intervenções em andamento, acompanhamento das medições e pagamentos, saneamento de eventuais pendências dos municípios e avaliação da necessidade de novas intervenções. Nos primeiros 100 dias da nova gestão, recomenda-se realizar diagnóstico atualizado da execução física e financeira e definir cronograma de continuidade/conclusão das ações.
Orçamento	**Orçamento empenhado até ago/2026**: R$ 300.000.000,00 **Orçamento liquidado até ago/2026**: R$ 263.641.180,43 **Fonte do recurso:** Funrigs
Pontos críticos e riscos	Garantir a continuidade dos serviços e dos contratos vigentes;

	Acompanhar a execução física e financeira das intervenções; Sanar eventuais pendências documentais dos municípios; Assegurar a regularidade das medições, liquidações e pagamentos; Acompanhar os prazos contratuais e eventuais necessidades de prorrogação; Garantir disponibilidade orçamentária e financeira para conclusão das ações; Considerar a ocorrência de novos eventos climáticos que possam alterar as prioridades de atendimento.
Recomendações	Manter o Programa como ação prioritária de prevenção e mitigação dos impactos de eventos climáticos, assegurando a continuidade das intervenções em andamento. Recomenda-se fortalecer o monitoramento físico-financeiro, consolidar os resultados por município e estabelecer indicadores para acompanhamento da execução, incluindo volume desassoreado, municípios atendidos, percentual de execução e recursos empenhados, liquidados e pagos.
Mais informações	Programa Desassorear RS – SEDUR Plano Rio Grande / FUNRIGS Termos de Cooperação com os municípios Contratos e processos administrativos relacionados ao programa Termo de Referência – Processo nº 24/2600-0000719-3 TR_Desassoreamento_18-10_final_… Sistema FPE – execução orçamentária e financeira Relatórios de fiscalização, medições e acompanhamento físico-financeiro

CONTRATOS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Contratado	Valor	Vigência	Status
PROA N° 24/2600-0000719-3 FPE: 023049/24	Execução de serviços de desassoreamento, limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais, incluindo operação e transporte	Consórcio Desassoreamento RS – AGR Engenharia e Empreendimentos Ltda. (líder), Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda., Ramon Aguilera Participações e	R$ 301.297.000,00	12 meses, prorrogável por igual período	Em execução

		Empreendimentos Ltda. e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.			
PROA N° 26/2600-0000899-9	Suplementação de recursos para o Programa Desassorear	Consórcio Desassoreamento RS – AGR Engenharia e Empreendimentos Ltda. (líder), Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda., Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda. e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.	R$ 30.000.000,00	12 meses, prorrogável por igual período	Em execução

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO				
Objeto	**Localização**	**Valor**	**% executado**	**Status**
Serviços de desassoreamento e limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais	Diversos municípios do RS contemplados pelo Programa Desassorear RS	Conforme Termos de Cooperação/ordens de serviço		Em execução

10. Horas-máquina

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Programa Horas-máquina/ áreas urbanas
Base legal	- Decreto Nº 57.647, de 3 de junho de 2024. - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Instrução Normativa - CAGE nº 4, de 16 de outubro de 2024. - Resoluções Autorizativas nº06/2024, nº 04/2025, nº 26/2026.
Unidade responsável	Departamento de Apoio às Cidades – DAC
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras dos municípios contemplados pelo programa.
Objetivo	O programa voltado aos municípios atingidos pelas enchentes tem como objetivo principal disponibilizar maquinário pesado para apoiar a recuperação da infraestrutura local. A iniciativa

	fornece o suporte operacional com equipamentos e máquinas para acelerar a execução de serviços essenciais de limpeza, desobstrução de vias e remoção de entulhos. O foco é restabelecer a trafegabilidade, garantir o acesso a áreas isoladas e auxiliar na reconstrução urbana e rural das regiões afetadas, sem realizar repasses financeiros diretos.
Justificativa	As enchentes de 2023 e 2024 causaram danos à infraestrutura urbana e rural dos municípios gaúchos, comprometendo a mobilidade, o acesso a localidades e a segurança da população. Nesse contexto, o Programa Horas-Máquina justifica-se pela necessidade de apoiar os municípios atingidos na recuperação de áreas afetadas, por meio da contratação de equipamentos para limpeza, desobstrução de vias, remoção de entulhos, abertura de estradas, terraplanagem e recuperação de estruturas danificadas. A iniciativa busca agilizar o restabelecimento dos serviços essenciais, contribuir para a retomada das atividades econômicas e promover a reconstrução dos territórios com maior segurança e resiliência.
Principais instrumentos	Por meio de Termo de Cooperação, a Sedur viabiliza a abertura de estradas; a terraplanagem para a construção de habitações; a limpeza de terrenos; e a reestruturação de cabeceiras de pontes. São disponibilizadas máquinas como caminhão caçamba truck, escavadeiras hidráulicas (com rompedor e concha), pá carregadeira, trator de esteira, prancha para transporte e equipamentos específicos para demolição.
Público-alvo e abrangência	Municípios atingidos pelas enchentes de 2023/2024, em emergência ou calamidade.
Beneficiários diretos	A população que reside nas cidades atingidas pelas enchentes de 2023/2024 e a atividade econômica do Estado.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [**X**] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** Em execução do programa: 24 municípios com os serviços em execução. 10 municípios programados para iniciar os serviços. 51 municípios planejados aguardando habilitação. Totalizando 85 municípios em andamento.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Realizar a habilitação de municípios, programar o início dos serviços, acompanhando

	a execução através de fiscalização, e realizar a prestação de contas correspondente a cada serviço executado por município. A previsão é que as Assinaturas dos Termos de Cooperação e a emissão das Ordens de Início para os "planejados" sejam emitidas até 15 de novembro de 2026.
Orçamento	**Orçamento empenhado até ago/2026:** R$ 73.496.881,99 **Orçamento liquidado até ago/2026:** R$ 20.469.477,00 **Fonte do recurso:** FUNRIGS
Pontos críticos e riscos	Prazo final do FUNRIGS.
Recomendações	Acompanhar de forma sistemática a execução dos convênios celebrados no âmbito do programa, monitorando prazos, etapas de execução, prestação de contas, eventuais pendências documentais e necessidade de apoio técnico aos municípios, de modo a assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas e a adequada aplicação dos recursos, especialmente em razão do prazo final de utilização dos recursos vinculados ao FUNRIGS.
Mais informações	O programa Horas-Máquina deve ser adaptado e institucionalizado como uma política pública permanente para atuar de forma preventiva e ágil em municípios vulneráveis a riscos por catástrofes climáticas. Essa perenidade garantirá suporte contínuo na reconstrução e na mitigação de desastres, fortalecendo a resiliência das cidades gaúchas frente a eventos extremos.

CONTRATOS E RESOLUÇÕES EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Número	Objeto	Contratado	Valor	Vigência	Status
22866/2025	Horas-máquina	MAK SERVICOS E PAVIMENTACOES LTDA	R$ 73.496.882,00	12 meses	vigente
23904/2024	Horas-máquina	MAK SERVICOS E PAVIMENTACOES LTDA	R$ 24.639.645,00	12 meses	vigente
Resolução 26/2026	Horas-máquina	—	R$16.613.691,52	—	Projeto Aprovado – em andamento

O programa não possui licitação em andamento.

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Planejado	Executado	Status

Limpeza e recuperação de estradas	Anta Gorda	R$ 378.160,00	R$ 378.160,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Barão de Cotegipe	R$ 399.932,00	R$ 399.932,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Barra do Guarita	R$ 361.162,00	R$ 361.162,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Barra Funda	R$ 399.970,00	R$ 269.460,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Chiapetta	R$ 399.759,00	R$ 399.759,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Gentil	R$ 329.522,00	R$ 74.200,00	Em operação
Limpeza da Orla	Guaíba	R$ 800.000,00	R$ 276.900,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Novo Tiradentes	R$ 191.161,00	R$ 30.000,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Pinhal	R$ 207.976,00	R$ 52.800,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Ponte Preta	R$ 399.746,00	R$ 172.400,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Rodeio Bonito	R$ 399.802,00	R$ 249.000,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Sagrada Família	R$ 303.291,00	R$ 48.235,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Santa Tereza	R$ 399.663,00	R$ 395.400,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Santo Expedito do Sul	R$ 396.876,00	R$ 167.090,00	Em operação
Demolição da ponte	São Gabriel	R$ 799.890,00	R$ 371.180,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Trindade do Sul	R$ 355.594,00	R$ 294.330,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Ubiretama	R$ 399.934,00	R$ 338.430,00	Em operação
Limpeza e recuperação de estradas	Vista Alegre do Prata	R$ 332.683,00	R$ 225.300,00	Em operação

Limpeza e demolição	Arroio do Meio	R$ 4.999.395,00	R$ 3.364.914,00	Em operação
Limpeza, demolição e preparação para loteamento	Eldorado do Sul	R$ 1.483.816,00	R$ 594.920,00	Em operação
Limpeza e demolição	Estrela	R$ 5.191.668,50	R$ 1.837.419,00	Em operação
Limpeza e demolição	Lajeado	R$ 5.108.564,00	R$ 506.380,00	Em operação
Limpeza, preparação para loteamento e demolição	Roca Sales	R$ 4.290.347,00	R$ 187.750,00	Em operação
Limpeza, recuperação de estradas	Roca Sales	R$ 709.653,00	R$ 513.615,00	Em operação
Limpeza e demolição	Venâncio Aires	R$ 4.991.918,00	R$ 2.676.170,00	Em operação

11. Programa Pavimenta 1


IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Programa Pavimenta 1
Base legal	Decreto Nº 55951, de 21 de junho de 2021.
Unidade responsável	Departamento de Apoio às Cidades - DAC
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras gaúchas.
Objetivo	Realizar obras de pavimentação, com impacto na infraestrutura e na qualidade de vida nas cidades, proporcionando mais conforto, segurança e mobilidade para as pessoas, além de garantir economia ao transporte de mercadorias. A melhoria urbana vem para facilitar o acesso a serviços públicos e contribuir para o bem-estar e a saúde da população.
Justificativa	A necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura viária dos municípios gaúchos, melhorando as condições de trafegabilidade, segurança e acessibilidade, justifica a implementação do Programa Pavimenta. Por meio da parceria entre o Estado e as gestões municipais, a iniciativa viabiliza obras de pavimentação e infraestrutura complementar, contribuindo para a mobilidade

	urbana, o acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população.
Principais instrumentos	Convênio com os municípios gaúchos participantes, que elaboraram os projetos e contribuem com contrapartidas financeiras. As obras contemplam pavimentação (asfalto ou bloco de concreto); terraplanagem; drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes); sinalização; e acessibilidade, por meio da aplicação de concreto, asfalto, pedra poliédrica ou bloco intertravado. Para participar, os municípios devem acompanhar o chamamento público realizado pelo Governo do Estado e, na sequência, apresentar seus projetos à Sedur, que, após aprovação, autoriza a liberação de verba estadual para execução da obra.
Público-alvo e abrangência	O programa abrange os municípios gaúchos participantes, tendo como público-alvo a população local.
Beneficiários diretos	População que reside nas cidades, favorecendo a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. A pavimentação melhora significativamente a segurança viária, reduzindo riscos de acidentes e proporcionando condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O programa alcançou resultados expressivos de infraestrutura e mobilização financeira, destacando-se a pavimentação de 590 km de vias e o atendimento a 408 municípios (82,09%) através de 409 projetos. A execução física das obras apresenta um alto grau de avanço, com 370 projetos já concluídos, 37 em andamento e apenas 2 ainda não iniciados. No âmbito financeiro, o programa mobilizou um investimento total planejado de R$ 671,88 milhões, impulsionado em parte por uma contrapartida municipal de R$ 293.659.155. A execução dos repasses estaduais demonstra alta eficiência, já tendo sido realizado o pagamento de R$ 374.382.999, o que corresponde a 99,11% do montante planejado de R$ 378.224.604.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** No momento há 1 (um) municípios que ainda não iniciaram as obras, 37 (trinta e sete) entes que já estão em execução e 370 (370) convênios executados.

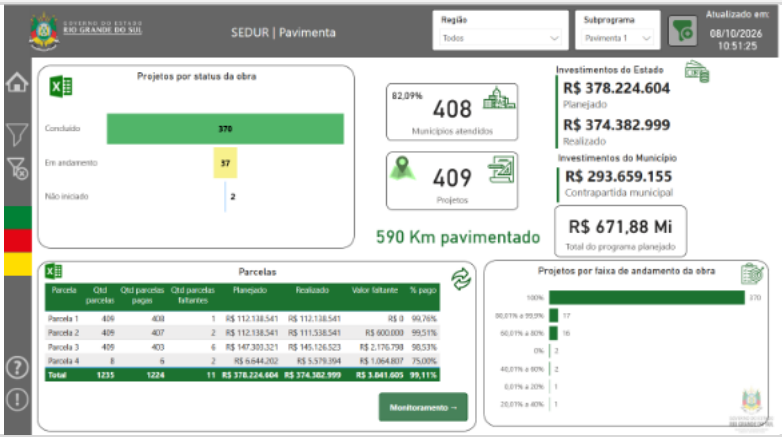Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Finalização
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** R$ 0,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:**R$ 378.224.604 **Orçamento liquidado até ago/2026.** R$ 374.382.999 **Orçamento LOA 2027:** R$ 0,00 U.O 26.01 Projeto 3074 Subprojeto 00001 Natureza despesa 4.4.40.42 Fonte Recurso 0267
Pontos críticos e riscos	Risco de o ente municipal não finalizar a obra.
Recomendações	Prazo para o ente municipal executar a obra para evitar recursos retidos por longos períodos ou anos que poderiam ser usados em outros locais ou programas.
Mais informações	

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Valor	% executado	Status
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação e qualificação de vias urbanas no município de Aceguá/RS.	Aceguá	R$ 800.000,00	72,62%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação asfáltica.	Aratiba	R$ 353.807,31	10,00%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente	Arroio do Tigre	R$ 800.000,00	78,45%	Em andamento

pavimentação de via e construção de ciclovia.				
Pavimentação asfáltica na estrada da comunidade do Remanso do Uruguai com acesso à comunidade de Jabuticaba, com extensão de 960 metros, que beneficiará a trafegabilidade, o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico, turístico e social da cidade.	Barra do Guarita	R$ 838.087,87	99,27%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na avenida Visconde do Rio Grande, com extensão de 840 metros, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região.	Barra do Ribeiro	R$ 850.415,08	94,07%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação em vias do município.	Barros Cassal	R$ 992.062,31	38,50%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente a pavimentação da Avenida Airton Senna, e recapeamento da Rua Dorval Ribeiro, totalizando 5.800 metros, visando melhorias na mobilidade e escoamento da produção e insumos ao Distrito Industrial, de acordo com o Plano de Trabalho.	Camaquã	R$ 2.000.000,00	89,00%	Em andamento
Pavimentação da Estrada de Acesso ao Aqueduto, com 1055 metros de extensão. Ponto turístico regional, com arquitetura Alemã.	Candelária	R$ 1.499.017,00	98,58%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em trecho da ERS 533, com extensão de 700 metros, que beneficiará as comunidades rurais que utilizam a estrada para escoamento de sua produção agrícola, bem como para o acesso a equipamentos	Capão do Cipó	R$ -	0,00%	Não iniciado

públicos existentes, que são a Escola Municipal e a Unidade de Saúde do Município. O trecho permite acesso ao município de São Miguel das Missões.				
Pavimentação do acesso ao trevo Desvio Rizzo com ligação das ruas Alexandre Rizzo, Nilceu de Melo Catarina, Cristiano Ramos de Oliveira, Vitório Lago, Clemente Fruet, no Bairro Desvio Rizzo, com extensão de 1.800 metros, em importante corredor de mobilidade local.	Caxias do Sul	R$ 4.000.000,00	47,60%	Em andamento
Pavimentação da Estrada Velha, com 2.156 metros de extensão, ligação do município com Panambi.	Condor	R$ 1.000.000,00	97,58%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente construção do trevo de acesso à cidade de Cristal do Sul, junto à ERS 587 (KM 17), com extensão de 400 metros, via que será fundamental para o escoamento da produção de grãos, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.	Cristal do Sul	R$ 682.940,10	76,72%	Em andamento
Pavimentação de cinco vias importantes da cidade, onde se localizam escolas, igrejas e unidade básica de saúde. O trecho dá acesso entre o município de Engenho Velho e a RS 324. Extensão da obra: 2.000,00 metros	Engenho Velho	R$ 893.504,57	94,97%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente a pavimentação de estrada vicinal	Esperança do Sul	R$ 792.955,33	71,34%	Em andamento

com pedras irregulares, com extensão de 2.690 metros, que irá facilitar o acesso para o desenvolvimento rural, para o transporte de paciente, para o transporte de produção, para o transporte escolar, além de facilitar acesso há vários pontos turísticos, pois grandes eventos acontecem anualmente, tais como: Festa do Peixe, Moto Romaria em homenagem aos Mártires Padre Manoel Gonzales e Coroinha Daronch; pontos turísticos para visitação, tais como o Salto Yucumã.				
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente a pavimentação da Rua Portão, com 1882 metros de extensão, ligando as ERS 239 e 240, e ao bairro Industrial, de acordo com o Plano de Trabalho.	Estância Velha	R$ 2.000.000,00	74,89%	Em andamento
Pavimentação com pedras regulares de basalto na avenida Lauro Billig de Castilhos, com extensão de 707 metros, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico e social.	Estrela Velha	R$ 800.000,00	70,07%	Em andamento
Pavimentação de diversas vias da área urbana do município, com 1872 metros de extensão, utilizando pedras irregulares.	Garruchos	R$ 1.000.000,00	71,87%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação das ruas Luiz Lovatto, Victorio Alberto Grando, Afonso Sachett e Marci Luiz Nardi, todas localizadas na área urbana do município, especialmente no entorno do Ginásio Municipal de Esporte João Lazzari, que recebe grandes eventos da cidade e da	Ibarama	R$ 841.171,03	89,01%	Em andamento

região. Obra com extensão de 735,23 metros, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.				
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente obra de pavimentação com extensão de 1.203 metros, na Estrada de acesso à Comunidade da Linha Gramadinho no município de Ilópolis/RS. Público alvo: 50 famílias, 5 agroindústrias de erva-mate e comércio local, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.	Ilópolis	R$ 682.880,40	99,38%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente a Avenida Tapajós, com extensão de 1.378 metros, de acordo com o Plano de Trabalho.	Imbé	R$ 1.799.456,77	90,00%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação de acesso ao Santuário Nossa Senhora da Salete, com 700 metros de extensão, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente Termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.	Ipiranga do Sul	R$ 667.574,07	93,00%	Em andamento

Pavimentação da Rua do Cristo, de acesso ao Mirante do Cristo Redentor do município de Jaquirana, RS. Extensão da obra: 620 metros.	Jaquirana	R$ 400.000,00	89,99%	Em andamento
Recapeamento das ruas Barão do Triunfo, Alfredo dos Santos, Tenente Coronel Gomes e Siveira Martins, localizadas na cidade, totalizando 532 metros de extensão.	Jari	R$ 512.017,73	74,20%	Em andamento
Pavimentação com pedras irregulares de basalto ou blocos de concreto intertravados, ligando o trecho norte da Avenida José Luchse ao acesso asfáltico da RS 400, com extensão de 600 metros.	Lagoa Bonita do Sul	R$ 800.000,00	75,00%	Em andamento
Pavimentação de trecho de 235 metros de extensão, da Avenida Manoel Brito. Área central do município, onde situa-se o Ginásio e a Prefeitura. Serão realizados serviços de pavimentação da pista de rolamento com paralelepípedos e colocação de meio fio.	Lagoão	R$ 378.076,90	95,41%	Em andamento
A pavimentação da via é de extrema importância para facilitar o fluxo de veículos, bem como para escoamento da produção, já que é o principal acesso dos bairros São Bento à RS 413, com extensão de 1094 metros.	Lajeado	R$ 1.533.524,20	76,48%	Em andamento
Pavimentação de 700 metros. A estrada ERS-484 é uma estrada vicinal que atende 90% de toda a população de Maquiné, cortando o município ao meio, atendendo a mobilidade urbana e as linhas de transporte coletivo urbano, intermunicipal, municipal, o escoamento de 80% de toda produção hortifrúti granjeiros, que é a principal fonte de renda do município. Pela via, moradores acessam serviços básicos, assim como se deslocam para suas residências,	Maquiné	R$ 951.010,93	90,00%	Em andamento

trabalhos, escola e posto de saúde. Em dias de chuva, a estrada se torna praticamente inacessível, com lodo, acúmulo de água e, ainda, não possui passeio para pedestre, o que dificulta o acesso, inclusive, de deficientes, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.				
Pavimentação asfáltica na Estrada Geral do Boqueirão, com extensão de 350 metros, via de acesso ao município e que atende o ponto turístico e símbolo cultural do município.	Mariana Pimentel	R$ 300.000,00	74,52%	Em andamento
Pavimentação com blocos intertravados da Avenida Santa Lúcia, bairro Guaporé, extensão de 1.400 metros, de apelo Turístico, sendo o principal acesso ao Viaduto 13.	Muçum	R$ 799.400,00	73,27%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente obra de pavimentação asfáltica da VRS 351, estrada que liga o município de Nova Bassano com o município de Serafina Corrêa. Extensão da obra: 9 mil metros, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.	Nova Bassano	R$ 1.000.000,00	73,99%	Em andamento
Pavimentação da Avenida 28 de Dezembro, com 346 metros de extensão, com blocos de concreto, que irá ligar a região da Várzea e Sede.	Novo Cabrais	R$ 849.932,23	62,00%	Em andamento
Pavimentação da Rua Coronel Evaristo, com 2.200 metros, que facilitará o escoamento de produção, proverá área subdesenvolvida no conjunto urbano, pois facilitará sua ocupação.	Palmeira das Missões	R$ 2.000.000,00	83,00%	Em andamento

Ligação pavimentada de pedras irregulares do município de Panambi ao município de Condor.	Panambi	R$ 1.260.644,73	91,46%	Em andamento
Execução do trevo de acesso ao município, na ERS 405, com extensão de 325 metros.	Passo do Sobrado	R$ 800.000,00	42,90%	Em andamento
Pavimentação poliédrica de estrada vicinal que liga a ERS - 528 a RSC -163 entre as cidades de Pinheirinho do Vale e o distrito do Basílio da Gama, com extensão de 1.000 metros.	Pinheirinho do Vale	R$ 850.388,70	72,57%	Em andamento
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente Pavimentação do acesso ao Parque Municipal Toca da Tigra, pavimentação com blocos intertravados de concreto e meio fio de concreto, no trecho compreendido entre a Rua dos Rodrigues e o pórtico do Parque Toca da Tigra, em Santana da Boa Vista, com extensão de 2.000 metros. O projeto visa melhorar o aproveitamento dos espaços turísticos, visando o desenvolvimento local, de acordo com o Plano de Trabalho, aprovado e anexo ao presente termo, que o integra, inclusive quanto ao cronograma físico-financeiro e ao atingimento das suas finalidades, para todos os efeitos.	Santana da Boa Vista	R$ 1.000.000,00	90,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na Estrada da Reserva, com extensão de 3.500 metros, que beneficiará o acesso ao Hospital da Reserva, referência para a região.	São Lourenço do Sul	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente asfaltamento do primeiro trecho da Rua Novo Hamburgo entre	Sapiranga	R$ 1.673.096,60	80,56%	Em andamento

as RS 239 e Av. Carlos Gilberto Weiss (próximo a Polícia Rodoviária Estadual), com extensão de 1.125 metros, de acordo com o Plano de Trabalho.				
O presente convênio tem por objeto a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente execução de obra de arte para transposição da RS 040, para melhorar a mobilidade da região.	Viamão	R$ 3.988.213,20	64,05%	Em andamento

12. Programa Pavimenta 2


IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Programa Pavimenta 2
Base legal	Decreto Nº 55951, de 21 de junho de 2021.
Unidade responsável	Departamento de Apoio às Cidades - DAC
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras gaúchas.
Objetivo	Realizar obras de pavimentação, com impacto na infraestrutura e na qualidade de vida nas cidades, proporcionando mais conforto, segurança e mobilidade para as pessoas, além de garantir economia ao transporte de mercadorias. A melhoria urbana vem para facilitar o acesso a serviços públicos e contribuir para o bem-estar e a saúde da população
Justificativa	A necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura viária dos municípios gaúchos, melhorando as condições de trafegabilidade, segurança e acessibilidade, justifica a implementação do Programa Pavimenta 2. Por meio da parceria entre o Estado e as gestões municipais, a iniciativa viabiliza obras de pavimentação e infraestrutura complementar, contribuindo para a mobilidade urbana, o acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população.

Principais instrumentos	Convênio com os municípios gaúchos participantes, que elaboraram os projetos e contribuem com contrapartidas financeiras. As obras contemplam pavimentação (asfalto ou bloco de concreto); terraplanagem; drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes); sinalização; e acessibilidade, por meio da aplicação de concreto, asfalto, pedra poliédrica ou bloco intertravado. Para participar, os municípios devem acompanhar o chamamento público realizado pelo Governo do Estado e, na sequência, apresentar seus projetos à Sedur, que, após aprovação, autoriza a liberação de verba estadual para execução da obra.
Público-alvo e abrangência	O programa abrange os municípios gaúchos participantes do Pavimenta 2, tendo como público-alvo a população local.
Beneficiários diretos	População que reside nas cidades, favorecendo a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. A pavimentação melhora significativamente a segurança viária, reduzindo riscos de acidentes e proporcionando condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O programa alcançou resultados expressivos de infraestrutura e mobilização financeira, destacando-se a pavimentação de 339 km de vias e o atendimento a 250 municípios (50,30%) através de 252 projetos. A execução física das obras apresenta um bom grau de avanço, com 189 projetos já concluídos, 56 em andamento e 7 ainda não iniciados. No âmbito financeiro, o programa mobilizou um investimento total planejado de R$ 448,74 milhões, impulsionado em parte por uma contrapartida municipal de R$ 181.789.558. A execução dos investimentos estaduais demonstra eficiência, já tendo sido realizado o pagamento de R$ 252.778.734, o que corresponde a 96,69% do montante planejado de R$ 266.951.473.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** No momento há 7 (sete) municípios que ainda não iniciaram as obras, 56 (cinquenta e seis) entes que já estão em execução e 189 (cento e oitenta e nove) convênios executados.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Acompanhamento e pagamento das parcelas.

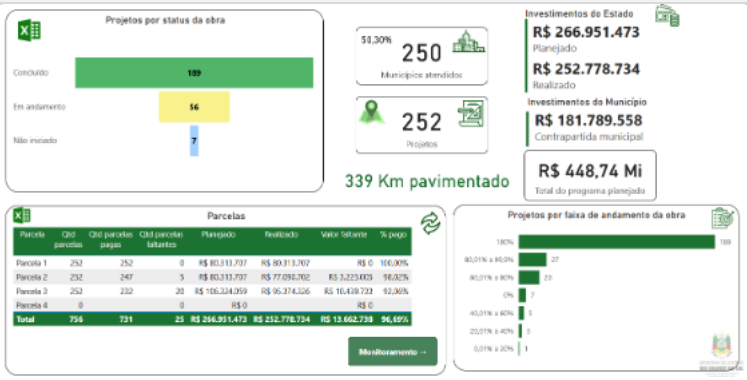Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** R$ 0,00 **Orçamento empenhado até out/2026:** R$ 266.951.473 **Orçamento liquidado até out/2026**:R$ 252.778.734 **Orçamento LOA 2027:**R$ 0,00 U.O 26.01 Projeto 3074 Subprojeto 00001 Natureza despesa 4.4.40.42 Fonte Recurso 0268
Pontos críticos e riscos	Risco de o ente municipal não finalizar a obra.
Recomendações	Prazo para o ente municipal executar a obra para evitar recursos retidos por longos períodos ou anos que poderiam ser usados em outros locais ou programas.
Mais informações	

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Valor	% executado	Status
Pavimentação da Rua Eleodoro Prates Garcia e ruas de acessos aos bairros, no total de 12.098,30 m².	Alegrete	R$ 2.000.000,00	76,33%	Em andamento
Calçamento da Rua Simão Borba e Avenidas Frank André Freitas, Lacy Didino Leite e Manoel José de Vargas.	Amaral Ferrador	R$ 1.000.000,00	98,00%	Em andamento
Pavimentação em blocos intertravados no trecho da Rota do Pão e do Vinho.	Anta Gorda	R$ 798.413,68	79,89%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na estrada AM 380 – Estrada Geral Forqueta Baixa – Trecho 3 - Extensão de 1.130,43 metros.	Arroio do Meio	R$ 1.400.000,00	98,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da Linha Torres Gonçalves, trecho localizado entre a ERS 332 e a sede da comunidade, com extensão de 2.000 metros.	Arvorezinha	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado

Pavimentação da Avenida Itália.	Bagé	R$ 1.591.608,86	78,27%	Em andamento
Capeamento asfáltico da Av. Reinaldo Kollet e Rua Antônio Moraes Viegas, com extensão de 1.526,29 metros.	Bom Retiro do Sul	R$ 1.000.000,00	97,40%	Em andamento
Pavimentação de vias urbanas.	Caçapava do Sul	R$ 1.443.960,00	79,48%	Em andamento
Pavimentação de vias do Bairro Arco Íris.	Capão da Canoa	R$ 2.000.000,00	83,00%	Em andamento
Pavimentação da Av. Narciso Silva e Rua João Batista Gomes.	Capão do Leão	R$ 2.000.000,00	70,02%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da localidade Santuário Diocesano, com extensão de 1.000 metros.	Caraá	R$ 700.000,00	5,00%	Em andamento
Pavimentação de acesso asfáltico com ciclovia e sinalização, e uma extensão de 700 metros.	Casca	R$ 800.000,00	90,13%	Em andamento
Pavimentação poliédrica nas Ruas 1º de Maio e Rua José de Anchieta, e pavimentação Asfáltica na Rua Theowald Hubert Kleinert.	Condor	R$ 1.000.000,00	98,62%	Em andamento
Pavimentação asfáltica nas ruas Marcelino Zadinelo, Edmundo Macedo, Soldado Teixeira Filho e Serafim Dapper.	Cristal do Sul	R$ 1.000.000,00	76,72%	Em andamento
Pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), na Rua João Shardong, Bairro Cascata, no município de Cruzeiro do Sul/RS.	Cruzeiro do Sul	R$ 4.989.014,13	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho das ruas Major Alencastro da Fontoura, Juventino de Moura, Gen, Carneiro e João Manuel.	Dom Pedrito	R$ 2.000.000,00	33,88%	Em andamento
Pavimentação e capeamento asfáltico em vias do município de Dona Francisca	Dona Francisca	R$ 1.000.000,00	69,86%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Estrada do Conde - Trechos 1 e 2, com área total 25.210,09 m².	Eldorado do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em blocos de concreto com 21.323,78 m² em vias urbanas onde serão pavimentas as seguintes ruas: Rua Gastão Gonçalves Lopes, Rua Tenente Cel. José Spalding Correa, Rua Francisco Xavier, Rua Eugênio Becker, Rua Amaranto Pereira, Rua Rui Barbosa, Rua Cel. Peixoto, rua sem	Encruzilhada do Sul	R$ 2.000.000,00	83,00%	Em andamento

denominação, Rua Paulo Geraldo e Rua Darci Azambuja, totalizando 2.991,97 m lineares.				
Pavimentação da Estrada das Acácias com extensão de 1.500 metros	Estrela	R$ 1.400.000,00	85,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da localidade Capela Santa Cruz/Linha Jacinto, com extensão de 1.828,28 m.	Farroupilha	R$ 1.500.000,00	86,50%	Em andamento
Construção de ciclovia paralela à via municipal com acesso à RS 324, em uma área de intervenção de 2.836,34 m².	Gramado dos Loureiros	R$ 914.893,73	29,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica de pedras irregulares na localidade Linha Campo Novo, com extensão de 21.000,00 metros quadrados.	Guarani das Missões	R$ 521.724,54	76,45%	Em andamento
Pavimentação com pedra irregular de basalto na Avenida Ottoni Amaro da Silveira e Rua Professora Luiza Cecília da Costa Nunes. Totalizando 8.561,65 m².	Herval	R$ 354.645,56	91,00%	Em andamento
Construção de 107,46 metros de extensão (1.132,04 m²) de pavimentação na R. Eugênio Kern.	Herveiras	R$ 240.000,00	70,00%	Em andamento
Pavimentação em bloco de concreto intertravado na Rua Valmor Bernardo Bonotto.	Lagoa Vermelha	R$ 2.000.000,00	73,18%	Em andamento
Execução de passeios em blocos de concreto.	Machadinho	R$ 403.859,25	75,11%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da localidade Estrada da Linha Santa Lucia, com extensão de 1.000,00 metros.	Muçum	R$ 1.000.000,00	99,67%	Em andamento
Projeto de capeamento asfáltico CBUQ em via urbana, na Rua João Batista Longhinotti.	Nonoai	R$ 1.000.000,00	96,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica de parte da rodovia que liga o município até a cidade de Montauri, com extensão de 7500 metros.	Nova Alvorada	R$ 1.000.000,00	90,79%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Rua 20 de Setembro, no Bairro Barro Preto, e pavimentação com blocos intertravados de passeios no Centro do município de Nova Ramada.	Nova Ramada	R$ 552.314,25	99,15%	Em andamento

Pavimentação com blocos de concreto em diversas ruas 4.078,67 m².	Novo Barreiro	R$ 996.718,16	81,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica e drenagem de vias dentro do perímetro urbano, com extensão de 4.104,4 metros.	Novo Hamburgo	R$ 4.000.000,00	67,31%	Em andamento
Pavimentação da Avenida Alfredo Nunes - Etapa 1, em bloco de concreto, com área total de 3.831,24 m².	Pantano Grande	R$ 1.000.000,00	92,93%	Em andamento
Pavimentação de acesso ao Distrito de São Roque.	Passo Fundo	R$ 4.000.000,00	73,78%	Em andamento
Pavimentação intertravada de trecho da Av. Comendador Ávila, com área de 8.218,94 metros quadrados.	Pedras Altas	R$ 1.000.000,00	70,04%	Em andamento
Implantação de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária; obras complementares e estudo topográfico no entorno da Estrada de Acesso à Comunidade Nossa Senhora do Rosário, no município de Ponte Preta/RS, região Norte do Estado do Rio Grande do Sul, o qual totaliza uma área a ser pavimentada de 7.837,20 m² (Sete mil e oitocentos e trinta e sete metros quadrados e vinte centímetros quadrados).	Ponte Preta	R$ 600.000,00	98,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Rua Severino Monteiro à Ascânio Tubino, com extensão 756,39 metros.	Quaraí	R$ 1.500.000,00	92,37%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Rua Armindo José Tronco, com extensão de 1.000,00 metros.	Restinga Sêca	R$ 609.435,58	46,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Estrada Geral Rio Pardo, com área total de 8725,00m²	Rio Pardo	R$ 1.400.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Rua Alberto Pasqualini, partindo do alinhamento com a Rua Franscisco Costa até a Rua Santa Rita.	Ronda Alta	R$ 700.000,00	93,97%	Em andamento
Pavimentação em CBUQ da Estrada Malhada, com área total de 17.442,46 m².	Santa Cruz do Sul	R$ 2.000.000,00	84,64%	Em andamento

Pavimentação em PVS e execução de passeios no Loteamento Popular Stringhini II.	Santa Tereza	R$ 858.936,37	0,00%	Não iniciado
Obras de pavimentação de 4.180,50 de área na Getúlio Vargas, fase II - no município de Santa Vitória do Palmar, com blocos intertravados de concreto.	Santa Vitória do Palmar	R$ 900.000,00	71,50%	Em andamento
Pavimentação do Anel Viário do município, no trecho do lado leste.	São Borja	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de 14.728,19 m² de bloco intertravado; 3.054,99 m de meio-fio em concreto pré-fabricado 264,06.	São José do Norte	R$ 1.700.000,00	83,81%	Em andamento
Pavimentação, microdrenagem, passeio público, acessibilidade e sinalização viária da Rua Matilde Muller, com extensão de 484,35m.	São Martinho da Serra	R$ 900.000,00	77,16%	Em andamento
Projeto de pavimentação do acesso à Estrada Azambuja - Trecho II.	São Valentim do Sul	R$ 900.000,00	96,60%	Em andamento
Pavimentação com CBUQ das ruas Quincas Maciel e General João Antonio, no Bairro Carapé.	São Vicente do Sul	R$ 836.050,58	50,00%	Em andamento
Pavimentação e drenagem na Estrada do Parque Zoológico e na Rua Leão.	Sapucaia do Sul	R$ 2.000.000,00	75,76%	Em andamento
Pavimentação com pedras irregulares na estrada que liga Senador Salgado Filho à Ubiretama.	Senador Salgado Filho	R$ 981.621,80	70,18%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em CBUQ, em parte da Av. Jorge Alfredo Streit e parte da Rua Darci de Col , com área de 4.676,00m².	Sertão	R$ 929.448,27	58,75%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em CBUQ, e qualificação de trechos da Rua Geromias Bavaresco, área 6.681,71.	Sobradinho	R$ 1.000.000,00	93,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Rua Danilo Angelo Stenzel, com extensão de 1.300 metros.	Tapejara	R$ 1.000.000,00	93,70%	Em andamento
Calçamento em pedra poliédrica da via Brasil em direção à comunidade do Alto Uruguai, com extensão de 4.058,40 metros.	Tiradentes do Sul	R$ 1.000.000,00	91,00%	Em andamento
Pavimentação da via de acesso à escola, CRAS e posto de saúde, visando melhor acesso aos	Toropi	R$ 700.000,00	50,00%	Em andamento

serviços. Obra com extensão de 1.000,00 m.				
Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Panisson, com extensão de 643,75 metros.	Tupanci do Sul	R$ 686.000,00	75,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na Rua Eustáquio Ormazabal, com extensão de 1.860,00 metros.	Uruguaiana	R$ 1.200.000,00	73,03%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da localidade Rua Ramiro Barcelos entre a Br-116 e Br-285 , com extensão de 926,60 metros.	Vacaria	R$ 800.000,00	94,79%	Em andamento
Pavimentação com blocos intertravados de concreto de trecho da Estrada Geral da Linha Andréas, com extensão de 2.486 m.	Vera Cruz	R$ 1.600.000,00	39,56%	Em andamento
Recapeamento CBUQ das vias Isidoro Guilherme Dall Agnol e Giocondo Toschi, com extensão total de 1,655,00.	Veranópolis	R$ 674.519,58	0,00%	Não iniciado
Calçamento com pedras regulares de paralelepípedo na localidade da Rua Vinte de Março, com extensão de 515 metros.	Vila Nova do Sul	R$ 934.182,45	87,05%	Em andamento
Calçamento em bloco de concreto de vias urbanas, com área de intervenção de 8.678,00 m².	Xangri-lá	R$ 900.000,00	44,07%	Em andamento

13. Programa Pavimenta 3

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Programa Pavimenta 3
Base legal	Decreto Nº 55951, de 21 de junho de 2021.
Unidade responsável	Departamento de Apoio às Cidades – DAC.
Órgãos e entidades parceiras (se houver)	Prefeituras gaúchas
Objetivo	Realizar obras de pavimentação, com impacto na infraestrutura e na qualidade de vida nas cidades, proporcionando mais conforto, segurança e mobilidade para as pessoas, além de garantir economia ao transporte de mercadorias. A melhoria urbana vem para facilitar o acesso a serviços públicos e contribuir para o bem-estar e a saúde da população.

Justificativa	A necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura viária dos municípios gaúchos, melhorando as condições de trafegabilidade, segurança e acessibilidade, justifica a implementação do Programa Pavimenta 3. Por meio da parceria entre o Estado e as gestões municipais, a iniciativa viabiliza obras de pavimentação e infraestrutura complementar, contribuindo para a mobilidade urbana, o acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população.
Principais instrumentos	Convênio com os municípios gaúchos participantes, que elaboraram os projetos e contribuem com contrapartidas financeiras. As obras contemplam pavimentação (asfalto ou bloco de concreto); terraplanagem; drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes); sinalização; e acessibilidade, por meio da aplicação de concreto, asfalto, pedra poliédrica ou bloco intertravado. Para participar, os municípios devem acompanhar o chamamento público realizado pelo Governo do Estado e, na sequência, apresentar seus projetos à Sedur, que, após aprovação, autoriza a liberação de verba estadual para execução da obra.
Público-alvo e abrangência	O programa abrange os municípios gaúchos participantes, tendo como público-alvo a população local.
Beneficiários diretos	População que reside nas cidades, favorecendo a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. A pavimentação melhora significativamente a segurança viária, reduzindo riscos de acidentes e proporcionando condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O programa iniciou a sua execução com o planejamento de 252 km de vias a pavimentar, visando o atendimento a 242 municípios (48,69%) através de 242 projetos. A execução física das obras encontra-se numa fase inicial, com 2 projetos já concluídos, 69 em andamento e 171 ainda não iniciados. No âmbito financeiro, o programa estipulou um investimento total planejado de R$ 362,03 milhões, suportado parcialmente por uma contrapartida municipal de R$ 130.515.112. A execução dos investimentos estaduais reflete este estágio embrionário, tendo sido realizado até o momento o pagamento de R$ 74.150.509 face ao montante planejado de R$ 231.511.807.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Etapa atual	**Status:** [ ] em planejamento [ ] em contratação [X] em execução [ ] encerramento **Descrição da etapa:** No momento há 171 (cento e setenta e um) municípios que ainda não iniciaram as obras, 69 (sessenta e nove) entes que já estão em execução e 2 (dois) convênios executados.
Próxima etapa	**Descrição da próxima etapa:** Acompanhamento dos objetos conveniados e repasse das parcelas.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026**: R$ 0,00 **Orçamento empenhado até ago/2026:** R$ 135.665.952,25 **Orçamento liquidado até ago/2026:** R$ 74.150.509 **Orçamento LOA 2027:** R$ 95,845,854.97 U.O 26.01 Projeto 3074 Subprojeto 00001 Natureza despesa 4.4.40.42 Recurso 0001
Pontos críticos e riscos	Risco do ente municipal não finalizar a obra.
Recomendações	Prazo para o ente municipal executar a obra para evitar recursos retidos por longos períodos ou anos que poderiam ser usados em outros locais ou programas.

OBRAS EM ANDAMENTO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

Objeto	Localização	Valor	% executado	Status
Execução de projeto de drenagem e pavimentação da rua 500.	Aceguá	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura e mobilidade urbana, por meio da realização da pavimentação asfáltica da Rua Antonio Simonetti e da Avenida Dario Roman, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Água Santa	R$ 987.815,27	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares da estrada da Linha 20 Norte / Linha 21 Norte.	Ajuricaba	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de pavimentação asfáltica sobre calçamento já existente,	Alecrim	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura urbana, por meio da realização de obra de pavimentação asfáltica de trechos das ruas: Prefeito João Orlando Schaedler, Vereador Emilio M. Kuhn e Pe. Afonso Seger, proporcionando melhorias na trafegabilidade, segurança e acesso contínuo da população aos serviços públicos, conforme especificações técnicas e legislação vigente.				
Pavimentação Asfáltica para revitalização das Ruas Papa Pio XII, São Lourenço, 7 de Setembro e Avenida 21 de Abril, no perímetro urbano de Alegria/RS.	Alegria	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação, drenagem e sinalização da Estrada Geral Linha Terceira – T3.	Anta Gorda	R$ 650.000,00	10,00%	Em andamento
Pavimentação com blocos intertravados de concreto na Rua Gustavo Emilio, com uma área total de 5.125,38m² e uma extensão de 410.50 metros.	Arambaré	R$ 480.919,86	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Estrada Municipal de Aratiba – Três Barras.	Aratiba	R$ 745.866,15	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica e drenagem na Rua João Antonio Rauber.	Arroio do Meio	R$ 1.200.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação das ruas José Rudniski e trecho da Rua Adão WalchinskI.	Áurea	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Avenida Alegrete (ETAPA 2), entre a Av. Castelo Branco e Rua 25 de Março (8.392,48 m²).	Balneário Pinhal	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Estrada Val Paraíso - Vila Rica.	Barão	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Implantação de Pavimentação em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), drenagem pluvial, e	Barão de Cotegipe	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado

sinalização viária da rua principal da comunidade de Wawruch. A obra está localizada no perímetro rural do município de Barão de Cotegipe, o qual totaliza uma área a ser pavimentada de 8.763,59m², que será executada sobre chão batido.				
Pavimentação e qualificação urbana da Rua Linha Dona Francisca e da Rua Pastor Jovelino Antonio da Silva.	Barão do Triunfo	R$ 900.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução da obra de Pavimentação Asfáltica na Rua Liberato Salzano, localizada no município de Barra do Guarita/RS.	Barra do Guarita	R$ 700.000,00	4,96%	Em andamento
Pavimentação asfáltica - Distrito Industrial: Avenida Alberto José Albertoni (Rua 01), rua sem denominação ainda (Rua 02).	Barra do Rio Azul	R$ 919.313,63	0,00%	Não iniciado
Implantação de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada Santa Lúcia, com extensão de 1,33 km.	Barra Funda	R$ 1.000.000,00	5,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica de acesso à Linha Zanandrea, município de Benjamin Constant do Sul.	Benjamin Constant do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em CBUQ, ruas diversas em Boa Vista das Missões/RS. Intervenções nas na Av. Demétrio Rigon, e nas ruas Militão Luis Fernandes, Lúcio Rocha, Arlindo Nogueira, Av. Érico Sagioratto e rua sem denominação.	Boa Vista das Missões	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Revitalização da pavimentação da Avenida São José.	Boa Vista do Buricá	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica nas ruas Franklin Werley, João José dos Santos, Padre Pedro Rubim e Palmena de Souza (Trechos 1 e 2), no município de Boa Vista do Incra/RS.	Boa Vista do Incra	R$ 900.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Linha Fátima - Trecho 1	Boa Vista do Sul	R$ 700.000,00	0,00%	Não iniciado

Execução das obras de pavimentação da Rua Otto F. Hartmann, em Bom Princípio/RS.	Bom Princípio	R$ 700.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na Rua Sinimbu.	Boqueirão do Leão	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em concreto (PUC) no município de Bossoroca/RS, contemplando a Avenida Castelo Branco, a Avenida Manoel Gonçalves do Nascimento e a Rua Dionísio Araújo.	Bossoroca	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Recapeamento asfáltico sobre calçamento com pedra irregular, nas ruas Carlos Drewin, Angelo Bonfada e Gabriel Cossetin.	Bozano	R$ 789.916,63	41,19%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Rua Guilherme Hartmann e da Rua Alberto Pilger.	Brochier	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Rua Alípio Rosa, localizada no Bairro Charrua, em Butiá/RS	Butiá	R$ 925.822,55	0,00%	Não iniciado
Pavimentação e drenagem pluvial em ruas do Bairro Sul, em Caçapava do Sul / RS.	Caçapava do Sul	R$ 1.100.000,00	0,00%	Não iniciado
Implantação de pavimentação asfáltica CBUQ na Rua Tarcísio Dal Moro, com área superficial 2.514,40 m.	Cacique Doble	R$ 600.000,00	1,20%	Em andamento
Execução de pavimentação em pedra irregular na Vila Costa do Forte, zona rural do município de Caibaté/RS.	Caibaté	R$ 663.938,43	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em CBUQ, na Comunidade Santa Lucia, município de Camargo/RS.	Camargo	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na Estrada do Ipê - RS 437 (trecho 01), no interior do município de Campestre da Serra.	Campestre da Serra	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho de rua e de Estrada Vicinal do município de Campina das Missões, contemplando a Rua José Arcádio Nedel e a Linha Oito de Maio.	Campina das Missões	R$ 1.000.000,00	5,00%	Em andamento

Pavimentação asfáltica, sob paralelepípedos e sobre leito natural - na via Rua Vitorino Bortolin - saída para Linha Santa Catarina, no município de Campinas do Sul/RS.	Campinas do Sul	R$ 831.025,88	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Linha Curitiba - Trecho 2	Candelária	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da rota de acesso à Escola Municipal de Educação Fundamental São Luiz Gonzaga.	Cândido Godói	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Repavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização na Rua Danton Corrêa da Silva, em Canela/RS	Canela	R$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de Estrada na localidade de Coxilha dos Campos, no município de Canguçu.	Canguçu	R$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica das ruas Catarino G. dos Santos, João Goulart, G. L. Brizola e Alcides N.Silva	Capão do Cipó	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho de ligação da Av. Três de Maio até a Rodovia BR 293.	Capão do Leão	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Rua José Gomes da Silva.	Caraá	R$ 911.798,37	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho da Rua Ampélio Carlotto, na extensão linear de 470 metros.	Carlos Barbosa	R$ 1.211.685,15	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Carlos Gomes.	Carlos Gomes	R$ 600.000,00	2,00%	Em andamento
Pavimentação em blocos intertravados de concreto na Rua Demétrio Cirino dos Santos.	Caseiros	R$ 990.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com blocos pavers intertravados, em trecho urbano do município de Caseiros RS, totalizando 7.495,00 m².	Caxias do Sul	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de 491,88 m de recapeamento asfáltico na Rua Oscar Lamb, no Centro de Cerro Branco.	Cerro Branco	R$ 1.000.000,00	5,00%	Em andamento

Obra de pavimentação asfáltica na via urbana Linha Sella.	Cerro Grande	R$ 900.000,00	96,82%	Em andamento
Execução de capeamento asfáltico de ruas no centro da cidade, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura, por meio da realização de capeamento asfáltico de trechos das ruas Dr. Henrique Vilanova- 284,08m, trecho da Av. Cel. Arthur Emilio Jenish- 85,00m, trecho da Av. Theodoro Zenker- 382,97m e trecho da Rua Dr. Jorge Alfredo Hennig - 100,00m e Rua Afonso Curtinaz Pacheco Filho - 64,93m, totalizando 916,98 m de extensão, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Cerro Grande do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de recapeamento asfáltico nos seguintes trechos: Rua Prof. Emílio Carlos Linck, Rua Padre Antônio Busch, Rua Lourenço Arenhart, Rua Adolfo Hassler e Rua Germano Boeni.	Chapada	R$ 474.157,04	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em estrada vicinal do município de Chiapetta.	Chiapetta	R$ 357.139,50	0,00%	Não iniciado
Obra de duplicação asfáltica da Avenida Presidente Vargas, com drenagem, sinalização e infraestrutura urbana.	Constantina	R$ 1.000.000,00	0,01%	Em andamento
Pavimentação de estrada vicinal - Estrada Faixa Anoni - trecho ponte – Cotrijal, com extensão de 1.175 metros.	Coqueiros do Sul	R$ 1.000.000,00	1,80%	Em andamento
Implantação de pavimentação asfáltica nas ruas Vicente Miorando e Avenida Fiovarante Franciosi.	Coxilha	R$ 800.000,00	1,22%	Em andamento
Pavimentação da Rua Caxias do Sul, Travessa Chuí, Travessa Santo Antonio e Rua São Paulo.	Cristal	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de pavimentação asfáltica de	Cruz Alta	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado

trecho da Estrada Lagoão, no Município de Cruz Alta/RS, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura urbana e mobilidade viária, por meio da implantação de pavimento asfáltico e sinalização horizontal e vertical, de acordo com as especificações técnicas aplicáveis e a legislação vigente, assegurando melhores condições de trafegabilidade, segurança viária e acesso qualificado a postos de saúde, unidades educacionais, bem como a integração entre a BR-158 e o distrito industrial do município.				
Pavimentação asfáltica na comunidade de São Pelegrino.	David Canabarro	R$ 984.455,27	10,00%	Em andamento
Execução de asfaltamento na Avenida Ibicul, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de saúde, educação, infraestrutura, assistência social etc., por meio da realização de pavimentação, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Dilermando de Aguiar	R$ 999.960,29	0,00%	Não iniciado
Capeamento na Avenida Sapiranga.	Dois Irmãos	R$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de pavimentação, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura, por meio da realização de pavimentação asfáltica na estrada da Comunidade Fernando Abott Monte Briga, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Dois Lajeados	R$ 1.000.000,00	98,86%	Em andamento
Pavimentação da Estrada Geral de Morro dos Leffa.	Dom Pedro de Alcântara	R$ 939.210,22	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica, drenagem e	Dona Francisca	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

sinalização da Av. Alberto Pasqualini.				
Pavimentação asfáltica da Linha Zanella.	Doutor Ricardo	R$ 1.000.000,00	20,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica (CBUQ) em 978,82 m dentro do perímetro urbano do município de Encruzilhada do Sul-RS	Encruzilhada do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trechos das Av. Angelo Lorini até a ponte, trecho da Av. João Provenzi, e trecho da rua Manoel Ferreira B.	Engenho Velho	R$ 600.000,00	98,78%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em parte das ruas Ignacio Wandscher, com 330,44 metros lineares (4.775,69 m²); Ceará com 362,13 metros lineares (4.749,10 m²); e João Pessoa com 218,53 metros lineares (1.843,20 m²). Totalizando uma área de 11.367,99 m² no centro da cidade.	Entre Rios do Sul	R$ 869.565,22	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da rua Dalila Lorenzoni.	Entre-Ijuís	R$ 1.000.000,00	0,01%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em parte da Av. Ouro Verde, e das ruas Vva. Ana Ciocari e Independência.	Erebango	R$ 850.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de 15.300,00m², com bloco intertravado de concreto da Rua Júlio Anzanello.	Erechim	R$ 1.400.000,00	1,47%	Em andamento
Repavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Erval Grande/RS, compreendendo a aplicação de camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimento existente, bem como a implantação de sinalização viária horizontal e vertical, conforme projeto executivo aprovado. As intervenções abrangem diversas ruas do município sendo elsas: Ruas 01 (extensão de 209 m e área 1.847,46m²) , 02 (extensão 64,95m e área de 386,45m²),	Erval Grande	R$ 1.000.000,00	28,25%	Em andamento

03 (extensão 200,1 m e área de 1.267,63m²), 04 (extensão 64,92m e área de 386,45m²), 05 (extensão 239,55m e área de 1.927,77m²), 06 (extensão 118,95m e área de 723,23m²), 07 (extensão 53,45m e área de 341,53m²), 08 (extensão 76,7m e área de 448,24m²) e parte da Rua Pinheiro Machado (T01 - extensão de 180,23 e área de 1.527,04 e T02 – extensão 188,9m e área 1.704,52m²)				
Pavimentação entre avenidas e distritos do município de Erval Seco.	Erval Seco	R$ 1.000.000,00	10,00%	Em andamento
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), em trecho da Rua Lido Tagliari, com 1.234,14 metros lineares, totalizando uma área de 12.341,41m² a ser pavimentada.	Estação	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação e drenagem das ruas Adriano de Quadros Bitencourt e Campo Sales	Estância Velha	R$ 1.800.000,00	0,00%	Não iniciado
Recapeamento asfáltico da Rua Bento Gonçalvez.	Esteio	R$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Estrada Paulo Mallmann.	Estrela	R$ 1.400.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação com pedra basáltica irregular, sistema de drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Sigma.	Faxinal do Soturno	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Estrada Nova Westfália.	Fazenda Vilanova	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Requalificação da Av. 25 de Julho, com melhorias na drenagem pluvial e recuperação do pavimento.	Flores da Cunha	R$ 970.789,45	0,00%	Não iniciado
Implantação de pavimentação asfáltica em partes das ruas Antonio Pauletti e Jacob Coltro.	Floriano Peixoto	R$ 600.000,00	28,75%	Em andamento
Recuperação de pavimentação asfáltica na Avenida 9 de Julho.	Fontoura Xavier	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na Villa Hass.	Forquetinha	R$ 1.000.000,00	12,07%	Em andamento

Pavimentação asfáltica, ligando o Bairro São Cristóvão (Escola Duque de Caxias) à Comunidade de Alto Alegre.	Frederico Westphalen	R$ 1.232.687,23	18,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica com CBUQ nas Ruas Paulino C. da Silva e Antonio Sasso Filho, com área de 16.998,00 m².	Garruchos	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de saúde, educação, infraestrutura, por meio da realização de infraestrutura conforme especificações técnicas e legislação vigente. A implantação de pavimentação asfáltica será nas ruas Passo Fundo, Valdir Alves Fagundes e Protásio Willibaldo Colling.	Gaurama	R$ 754.876,82	0,17%	Em andamento
Pavimentação asfáltica de trecho da ERS 458, trecho com extensão de 650,00m.	Gentil	R$ 900.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na rua Max Padaratz.	Getúlio Vargas	R$ 1.000.000,00	73,59%	Em andamento
Alargamento e requalificação do trecho ERS 030 no perímetro urbano de Glorinha.	Glorinha	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares (calçamento) e passeio em concreto, com assentamento de guia (meio fio) em trechos das ruas Orestes Giordani, João Batista Neto, Antonio Giordani, Virginio Ceresoli, visando a qualificação da malha viária urbana, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e segurança aos usuários.	Gramado dos Loureiros	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, de 2,24km, em rota alternativa de acesso Guabiju e região do Vale de Taquari.	Guabiju	R$ 1.000.000,00	0,01%	Em andamento
Execução de pavimentação, drenagem e sinalização viária	Harmonia	R$ 1.000.000,00	30,00%	Em andamento

no trecho Morro do Cedro – Etapa 03.				
Pavimentação de vias urbanas com pavimento de blocos intertravados em trechos das ruas do município de Herval/RS.	Herval	R$ 773.198,19	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na estrada de acesso à comunidade de Santa Terezinha.	Ibiraiaras	R$ 980.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica (recapeamento) nas ruas Três de Outubro e Antônio Selvino Rodrigues da Silva.	Ibirubá	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação do tipo CBUQ em vias urbanas de acesso a escolas e unidades básicas de saúde, na rua Dary Tissotti, rua Décio Betineli, rua Carolino Raimundo, rua Cruz Alta e rua Paulo Klemann.	Ijuí	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de 1.220 metros de pavimentação com blocos intertravados na Estrada Linha Borges, zona rural de Ilópolis	Ilópolis	R$ 700.000,00	28,00%	Em andamento
Pavimentação das ruas José Lorscheider, Fernando Ferrari, Guilherme Scheer e Pedro Rissi.	Imigrante	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial, da Rua Vitalino Cadore com 1.418,32 m²; Rua Elibio Correia da Cunha, com 832 m²; Rua Henriqueta de Jesus, trecho 1, com 1.212,24 m²; Rua Henriqueta de Jesus, trecho 2 com 840,96 m²; Rua Antonio Cleiton Pires, com 870,88 m²; Rua Esmelindro de Jesus ,com 832 m²; Rua Jane Fabiana dos Santos, com 832 m² e Damião Bairros do Rosário com 832 m².	Inhacorá	R$ 869.560,00	0,00%	Não iniciado
A execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária em trechos pontuais da comunidade Salgado Filho, trecho da via na saída para o	Ipiranga do Sul	R$ 1.000.000,00	4,51%	Em andamento

município de Quatro Irmãos, no sentido da comunidade de Salgado Filho, no interior do Município de Ipiranga do Sul/RS.				
Pavimentação com blocos intertravados de concreto - Rua José Candido da Silva Ribeiro; Rua Ouri Adão Rigon; Rua Andreas Skrebsky; Avenida Presidente João Goulart.	Itacurubi	R$ 950.924,18	0,00%	Não iniciado
Pavimentação Asfáltica na estrada da Linha Sétima, Município de Itapuca/RS.	Itapuca	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de serviços de pavimentação da Avenida Mário Lopes no município de Itaqui-RS.	Itaqui	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica com aplicação de CBUQ em parte da RST 137/Estrada Povoado Tozzo.	Itatiba do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica e construção de passeio público em trechos urbanos de Jacutinga – RS.	Jacutinga	R$ 1.000.000,00	1,30%	Em andamento
Capeamento asfáltico e melhorias estruturais na Rua 7 de Setembro.	Jaguari	R$ 1.000.000,00	1,00%	Em andamento
Pavimentação nas ruas Miguel Waihrich Filho, Osvaldo Aranha, Cirus Bastos, N. Loureiro, Dr Silvera Campos e José Mauricio de Campo.	Júlio de Castilhos	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica ligando a ERS 332 até a localidade de Linha Ojeriza (morada da Lagoa).	Lagoa dos Três Cantos	R$ 1.000.000,00	3,05%	Em andamento
Pavimentação da Rua Bento Gonçalves, Rua Getúlio Vargas e Rua Soledade.	Lagoão	R$ 897.780,00	0,00%	Não iniciado
Calçamento da Avenida Edu Moreira Teixeira, 2º Distrito de Lavras do Sul – Ibaré.	Lavras do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em vias urbanas no município.	Liberato Salzano	R$ 1.000.000,00	1,09%	Em andamento
Execução de obra de pavimentação em CBUQ e sinalizações na Rua Morro	Linha Nova	R$ 843.050,36	0,00%	Não iniciado

Grande, em trecho de 1.000 metros de extensão.				
Pavimentação asfáltica no acesso Roça da Estância - Trecho 01.	Mampituba	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação das ruas Presidente Vargas, Franklin Bastos de Carvalho e Avenida Ibicuí.	Manoel Viana	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Estrada Esperança.	Maratá	R$ 1.000.000,00	10,00%	Em andamento
Pavimentação das Ruas José Evaristo e Pederneiras.	Mariana Pimentel	R$ 700.000,00	0,50%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em parte da Rua Rio Branco e parte da Rua Tancredo Neves.	Mariano Moro	R$ 600.000,00	0,20%	Em andamento
Pavimentação da Estrada Geral Picada May.	Marques de Souza	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica CBUQ na estrada municipal que liga a Comunidade de Rincão dos Gonçalves até a BR-285, com uma área total a ser pavimentada de 5.071,99m².	Mato Castelhano	R$ 876.386,35	24,95%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Estrada Eloc, Flávio Rodrigues da Silva, em trecho de 1,44 km.	Mato Leitão	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares no Rincão dos Muller, numa extensão de 6.220,00 metros.	Mato Queimado	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Euclides Vescovi.	Maximiliano de Almeida	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica da Rua Miguel Wisniewski (6.220,95m²) - conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura, por meio da realização de serviços, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Minas do Leão	R$ 1.000.000,00	0,30%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na estrada vicinal para acesso ao Distrito de Silva Jardim, (Serafina Corrêa), Montauri/RS.	Montauri	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

Pavimentação asfáltica, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura, por meio da realização de obras de pavimentação na Linha 80 da Leopoldina, conforme especificações técnicas e legislação vigente. Extensão: 1.475,00m.	Monte Belo do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada Geral Morro do Forno - Trecho 04.	Morrinhos do Sul	R$ 869.565,22	0,30%	Em andamento
Realizar a pavimentação da estrada de acesso à Escola Pinto Martins e ao Posto de Saúde na localidade do Açoita Cavalo.	Morro Redondo	R$ 994.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Rua Pedro José Kolling e pavimentação da Rua Duque de Caxias.	Morro Reuter	R$ 800.000,00	1,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na rua Pedro Nery dos Santos.	Muitos Capões	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica - acesso David Canabarro.	Muliterno	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação dos subtrechos II e III que ligam a cidade de Nicolau Vergueiro até a comunidade de Estrela do Sul.	Nicolau Vergueiro	R$ 800.000,00	0,16%	Em andamento
Execução de pavimentação asfáltica nas Ruas Julio Golin e Rui Barbosa.	Nonoai	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ no prolongamento da Rua São Francisco, desde o acesso à Linha Duas Esquinas até a divisa com o município de Boa Vista do Buricá-RS.	Nova Candelária	R$ 721.539,75	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica na Rua Plácido de Castro, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade, com qualificação da infraestrutura viária pública que faz ligação com ESF Valentim Vielmo, Farmácia Pública Popular, Escola São	Nova Esperança do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

José e Escola de Educação Infantil Maria Malgarin Frizzo, entre outros equipamentos públicos.				
A pavimentação asfáltica do Trecho 4, no sentido do Bairro Barro Preto ao Formigueiro, tem por objetivo a ampliação de 4.550 m² de área pavimentada, em via com 7,00 metros de largura e 650,00 metros de extensão.	Nova Ramada	R$ 700.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação com pedras irregulares nas estradas da Linha Bela Vista e NB–Chapada, zona rural.	Novo Barreiro	R$ 1.000.000,00	0,57%	Em andamento
Pavimentação com blocos de concreto em 7.237 metros de vias na sede do município de Novo Cabrais.	Novo Cabrais	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas no município de Novo Tiradentes/RS.	Novo Tiradentes	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em trecho da estrada municipal de acesso à ERS 500, Linha Xingu Alto.	Novo Xingu	R$ 600.000,00	1,76%	Em andamento
Pavimentação da Estrada da Goiabeira no Município de Osório-RS.	Osório	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em trecho da Avenida Rio Grande, no município de Paim Filho, com área total de 7180m²	Paim Filho	R$ 595.464,79	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Avenida da Integração no município de Panambi/RS.	Panambi	R$ 2.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obras de pavimentação urbana nas ruas Aquiles Maria de Barros, Fernando Cardoso Sobrinho e Dr. Adair Jaques, com área total de 4.471,27 m², incluindo serviços de terraplanagem, drenagem, execução de base e sub-base, pavimentação e meios-fios.	Pantano Grande	R$ 836.152,93	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Rua Guajuvira até o Parque de	Passa Sete	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado



Eventos, com área total de 16.877,27m².				
Projeto de execução de recapeamento em via urbana.	Passo do Sobrado	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em trecho da Rua São Paulo.	Paulo Bento	R$ 1.000.000,00	42,00%	Em andamento
Pavimentação da Rua 04 de Julho – bairro Cidade Baixa - trecho 01 - com extensão de 660 m.	Paverama	R$ 1.000.000,00	67,55%	Em andamento
Execução de pavimentação asfáltica nas ruas Henrique Scarpellini, Alfredo Brenner, Luiz Furian, Padre José, José Daronco e Pedro Mastella. O objetivo é garantir vias urbanas seguras, acessíveis e duráveis para a comunidade.	Pejuçara	R$ 779.010,60	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica CBUQ na localidade de Serra dos Gregórios, numa área total de 4.460,04m².	Pinhal da Serra	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Recapeamento asfáltico das ruas XV de Novembro, Cesar Rubin, Jacobe Piusse, Amadeus Trevisan e José Rubin Filho.	Pinhal Grande	R$ 615.384,62	0,00%	Não iniciado
Recapeamento asfáltico de vias urbanas no município de Pinheirinho do Vale – RS.	Pinheirinho do Vale	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de capeamento asfáltico em vias urbanas do município de Planalto para melhoria da mobilidade e segurança viária.	Planalto	R$ 1.000.000,00	5,11%	Em andamento
Pavimentação asfáltica na Rua Bom Jesus.	Pontão	R$ 762.475,14	0,56%	Em andamento
Recapeamento asfáltico com CBUQ de diversas ruas, sendo elas Rua Paraguai, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Relly de Vlieger, Rua Barão do Rio Branco, Rua Valdemar Bordin, Rua João Alberto Bastos e Rua José Bonifácio.	Porto Lucena	R$ 796.971,42	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica de 13.921,96 m² em vias urbanas no entorno do ESF 3 e da EMEI Sonho Encantado.	Porto Xavier	R$ 1.000.000,00	0,57%	Em andamento

Pavimentação na Estrada Geral de Arroio do Leite, Município de Pouso Novo - RS.	Pouso Novo	R$ 847.260,36	0,00%	Não iniciado
Execução de intervenção pública, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social etc., por meio da realização da obra de pavimentação de trecho da via pública denominada Estrada Geral do Distrito de Xaxim, em um trecho de 1.100 m.	Progresso	R$ 1.000.000,00	0,50%	Em andamento
Pavimentação da Rua Júlio de Castilhos no perímetro urbano.	Putinga	R$ 860.435,88	0,00%	Não iniciado
A pavimentação asfáltica das Ruas A, C, D, Gregório Charchat e David Jovelevitch.	Quatro Irmãos	R$ 898.280,00	15,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em P.M.F. sobre Pedras Irregulares nos bairros Nove de Julho e Santa Lúcia.	Redentora	R$ 971.022,97	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da estrada entre Relvaldo e Putinga.	Relvado	R$ 800.000,00	5,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica da Estrada de São Nicolau- Rio Pardo/RS.	Rio Pardo	R$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação no Complexo Educacional no Bairro Piratini, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades de mobilidade, segurança e acessibilidade da população, especialmente da comunidade escolar e dos moradores do entorno, proporcionando melhores condições de tráfego, redução da poeira e da lama, bem como a qualificação do acesso de alunos, professores, servidores e transporte escolar .	Rodeio Bonito	R$ 700.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação das ruas Salgado Filho, Princesa Isabel e Santa Inês.	Ronda Alta	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado



Pavimentação asfáltica sobre base de pedra irregular e recapeamento de pavimentação existente, em 21.200,30 m², nas Ruas Independência I, Rua Tiradentes I, R. N. S. do Rosário, R. Pe. Eugenio- I, R. Pe. Eugenio- II- Cemitério, R. Pe. Eugenio- III, R. 7 de setembro, R. Julio Mailhos I, R. Julio Mailhos II, R. Julio Mailhos III e Rua Pe. Alfredo.	Rondinha	R$ 900.000,00	95,11%	Em andamento
Capeamento asfáltico na Avenida Rafael Gonçalves.	Rosário do Sul	R$ 1.799.959,11	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em CBUQ da Rua 14 - trecho 02; capeamento asfáltico da Rua 14 - trecho 01; recapeamento da rua Francisco L. Cardona e trecho Rua 20 de Março - Área urbana.	Sagrada Família	R$ 600.000,00	2,29%	Em andamento
Pavimentação da rua Prestes Guimarães em uma extensão de 420 metros.	Saldanha Marinho	R$ 830.000,00	0,00%	Não iniciado
Asfaltamento da Rua da Linha Santana.	Santa Cecília do Sul	R$ 990.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com bloco de concreto da Rua 20 de Setembro e Serrinha.	Santa Margarida do Sul	R$ 850.593,68	35,00%	Em andamento
Capeamento asfáltico de trecho da Rua Benno Closs – etapa 2.	Santa Maria do Herval	R$ 615.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de implantação de rua lateral e trevos de acesso na ERS-344 (TR. 344ERS0100).	Santa Rosa	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária, com extensão de 688,6m, na Linha Bento Gonçalves.	Santa Tereza	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação e sinalização nas ruas Norberto de Souza Leite, Esmeralda da Fronteira e Andradas.	Santa Vitória do Palmar	R$ 989.166,15	0,00%	Não iniciado
Capeamento Asfáltico - Ruas Coronel Tuca e Vinte de Setembro - Santiago/RS	Santiago	R$ 1.800.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica no trecho que liga a sede do	Santo Antônio do Palma	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

município até a Comunidade de Cristo Rei.				
Pavimentação asfáltica no município de São Francisco de Assis, na Rua Benjamin Chioqueta, entre as ruas Garibaldi e Coralino Lamberty.	São Francisco de Assis	R$ 847.861,73	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho da Rua Espanha, no Bairro Tainhas, principal via de acesso ao bairro e principal, ligação do bairro com a RS 020 e consequentemente principal acesso do bairro com o centro da cidade de São Francisco de Paula.	São Francisco de Paula	R$ 1.276.726,09	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho da Rua Francisco Silva.	São Gabriel	R$ 1.400.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de infraestrutura viária consistente na pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Júlio César Redecker – Trecho 04, localizada entre os municípios de São Jerônimo e Arroio dos Ratos, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura e mobilidade regional, por meio da execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização viária e obras complementares.	São Jerônimo	R$ -	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica nas Ruas Inês Paiz Zanandrea, Pedro Remussi e Antônio Zamboni, com área total de 4.155 m², conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade nas áreas de saúde, educação e assistência social, por meio da realização das obras de pavimentação asfáltica, conforme especificações técnicas e legislação vigente.	São João da Urtiga	R$ 758.084,07	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica em Concreto	São Jorge	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em Trecho da Avenida Daltro Filho.				
Pavimentação da Rua 1º de Maio, no Perímetro Urbano de São José das Missões.	São José das Missões	R$ 700.000,00	2,38%	Em andamento
Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho de 4.480,00m² na Estrada da Vigia, contemplando serviços preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária e serviços complementares.	São José do Hortêncio	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Implantação de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso à quente com drenagem pluvial na Estrada Municipal - Linha Pasinato, área situada predominantemente na zona rural.	São José do Ouro	R$ 700.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Estrada Luiz Dewes e Estrada da Varzea.	São José do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de acesso direto ao ambulatório municipal e à BR 285 para facilitar a chegada e saída de ambulâncias.	São José dos Ausentes	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Recapeamento asfáltico com CBUQ na Rua João Goulart, numa extensão de aproximadamente 1.067,00 metros.	São Luiz Gonzaga	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares na estrada municipal de ligação entre São Martinho e São Valério do Sul.	São Martinho	R$ 993.017,34	10,00%	Em andamento
Pavimentação em blocos, drenagem, passeio acessível e sinalização nas ruas Sete de Setembro e Possidônio Pedroso.	São Martinho da Serra	R$ 950.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica de diversos trechos de ruas em São Miguel das Missões.	São Miguel das Missões	R$ 1.000.000,00	0,01%	Em andamento

Pavimentação asfáltica até o acesso à escola, trecho da Rua XV de Novembro e trecho da Rua Borges de Medeiros.	São Pedro do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação em TSD da Av. Ver. Daia Gazen, com drenagem, meio-fio e obras complementares.	São Sepé	R$ 999.999,99	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica no acesso ao Distrito da Fazenda Fialho.	São Valentim do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica do pórtico à ponte São Valério - São Martinho.	São Valério do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de via no Morro Carrard , com 180m; e no Morro Canastra - Trecho 2 – com 440m.	São Vendelino	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação da Rua Antero Xavier (Trecho 3), com 360 metros.	São Vicente do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica no município de Sarandi, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura por meio da realização de pavimentação asfáltica conforme especificações técnicas e legislação vigente.	Sarandi	R$ 1.000.000,00	35,92%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre macadame seco e BGS, na Rua João Silvestrin, Distrito Industrial.	Serafina Corrêa	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura e mobilidade urbana/rural, por meio da pavimentação da estrada vicinal (Linha Exploração), estrada que liga o centro urbano de Sertão Santana ao Bairro Dobrada.	Sertão Santana	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica em trecho da estrada para Linha Primavera.	Sinimbu	R$ 999.998,08	0,00%	Não iniciado

Pavimentação e qualificação viária do Loteamento Popular Inácio Manoel da Silva.	Sobradinho	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica na Avenida Valdo Nunes Vieira, Luiz Costa e Luis Sitta	Tapejara	R$ 1.151.027,24	1,46%	Em andamento
Pavimentação de vias urbanas da Avenida Camaqua.	Tapes	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua José Orestes Rodrigues.	Taquari	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e passeios públicos das Ruas Walter Fries e Xavante.	Tenente Portela	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de pavimentação da Rua Inácio Justino, contemplando a implantação de infraestrutura viária adequada, com 6.001,00 m ², com serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e demais intervenções necessárias.	Terra de Areia	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação com pedras irregulares de trecho da Esquina Massoti à Linha da Praia.	Tiradentes do Sul	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de ruas urbanas.	Toropi	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Melhoria da qualidade viária da rua Salvador Pereira Guimarães, influenciando diretamente na maior eficiência do escoamento viário local.	Tramandaí	R$ 2.000.000,00	22,95%	Em andamento
Pavimentação asfáltica de trecho de aprox. 2,12 km da via que liga a localidade de Picada Felipe Essig/Três Saltos à sede e BR386.	Travesseiro	R$ 900.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra para pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., drenagem pluvial, sinalização viária, da estrada vicinal de acesso ao distrito de Coxilha Seca.	Três Arroios	R$ 600.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da Estrada Rio do Terra - Trecho 03.	Três Cachoeiras	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

Capeamento e recapeamento asfáltico na Rua Consolata.	Três de Maio	R$ 900.000,00	0,00%	Não iniciado
Capeamento asfáltico em CBUQ, na Avenida das Palmeiras e Rua Fernando Ferrari.	Três Palmeiras	R$ 1.000.000,00	0,01%	Em andamento
Pavimentação da Rua Guaranta - medindo 2773,19m²; pavimentação da Rua Balsamo; medindo 4553,41m² ; pavimentação da Rua Chorão, medindo 3074,22m².	Trindade do Sul	R$ 1.000.000,00	10,00%	Em andamento
Pavimentação em paralelepípedo na área urbana do município.	Tunas	R$ 800.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de obra de pavimentação asfáltica em via pública do município de Tupanci do Sul, visando à melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e da acessibilidade. A intervenção busca qualificar o acesso aos serviços de saúde e educação, assegurar melhores condições ao transporte escolar, fortalecer o escoamento da produção agrícola, e contribuir para o desenvolvimento local e regional, promovendo mais qualidade de vida à população.	Tupanci do Sul	R$ 980.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação da Rua dos Plátanos - Distrito Industrial, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área da saúde, educação e segurança viária, por meio da realização de obra de pavimentação asfáltica.	Tupandi	R$ 1.000.000,00	16,00%	Em andamento
Pavimentação da Estrada São Luís - Trecho entre o Distrito de Pulador e a Sede do município.	União da Serra	R$ 600.000,00	0,38%	Em andamento
Recuperação asfáltica de vias do município.	Uruguaiana	R$ 1.340.451,99	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica nas localidades rurais de Linha Trombudo e Faxinal de Dentro,	Vale do Sol	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

numa extensão de 1.000 metros				
Execução de pavimentação das Ruas Alfredo da Cunha, Armindo Dresch, Edgar Mielke e Shirley Kaspary, conforme plano de trabalho aprovado, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura urbana, por meio da realização de pavimentação de ruas.	Vale Real	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica das ruas Fredolino Gerhardt, Guilherme Meurer e Pedro Azeredo, com extensão total de 870 m, visando atender às necessidades da população nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana.	Vale Verde	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Capeamento asfáltico na Rua Presidente Vargas.	Vanini	R$ 709.000,00	20,00%	Em andamento
Pavimentação da Estrada de Santa Emilia.	Venâncio Aires	R$ 908.414,60	0,00%	Não iniciado
Pavimentação de trecho da Estrada de Linha Alta.	Vera Cruz	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Execução de pavimentação asfáltica da Rua Dondoni, parte da Rua Bevilaqua, e parte da Rua Querino Maito.	Viadutos	R$ 950.000,00	5,00%	Em andamento
Execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ – em trecho da Rua Aimoré.	Vila Flores	R$ 992.555,69	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica nas ruas Ivo José Bonfante e Sutel Kurtz Teixeira.	Vila Lângaro	R$ 906.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Linha São Paulo.	Vista Alegre	R$ 1.000.000,00	15,00%	Em andamento
Pavimentação asfáltica em CBUQ no acesso entre a Comunidade de Nossa Senhora da Pompéia e Nossa Senhora do Caravaggio.	Vista Alegre do Prata	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado
Pavimentação asfáltica a frio – PMF, na ligação entre a Avenida Nove de Maio com a RSC 163.	Vista Gaúcha	R$ 554.175,64	5,00%	Em andamento


Pavimentação em pedra irregular na Rua Albino Zago, Rua 20 de Março, Rua 23, Rua D, Rua Max Ropke, Rua 13, Rua 15 e Rua 1º de Maio.	Vitória das Missões	R$ 1.000.000,00	10,00%	Em andamento
Pavimentação de 18.976,84 m² na Avenida Diamante.	Xangri-lá	R$ 1.000.000,00	0,00%	Não iniciado

Seção II – Metroplan

IDENTIFICAÇÃO	
Nome e sigla	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan)
Site	www.metroplan.rs.gov.br
Endereço	Av. Padre Cacique, 708 - Menino Deus, Porto Alegre - RS
Base legal	Decreto Nº 23.856, de 08 maio de 1975
Competências legais	É o órgão de gestão urbana e regional do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado entre os municípios. Atua em gestão e planejamento no âmbito estadual e na medida de suas atribuições, predominantemente na Região Metropolitana de Porto Alegre, Aglomeração Urbana do Nordeste, Aglomeração Urbana do Litoral Norte e Aglomeração Urbana do Sul. Nessas áreas estão localizados cerca de 5,4 milhões de habitantes, representando aproximadamente 51% da população gaúcha, ocupando 7% da área territorial do Estado, onde se concentra cerca de 70% da economia do Rio Grande do Sul. Atua no gerenciamento do Transporte Coletivo Intermunicipal nos municípios da Região Metropolitana (34 municípios) e Aglomerações Urbanas (34 municípios). Suas ações referem-se ao planejamento e controle operacional do sistema: horário, itinerário, condições da frota, urbanidade do pessoal de operação, cálculo tarifário e regulamentação do transporte de fretamento.
Número de servidores	Total: 68 • Contratados: 21 • Temporários: 14 • Adidos: 4 • Dirigentes: 4 • Comissionados: 25
Número de estações de trabalho (presencial)	154 Sendo 140 em Porto Alegre, 6 em Caxias do Sul, 5 em Osório e 3 Pelotas.

Organograma

ORGANOGRAMA SIMPLIFICADO

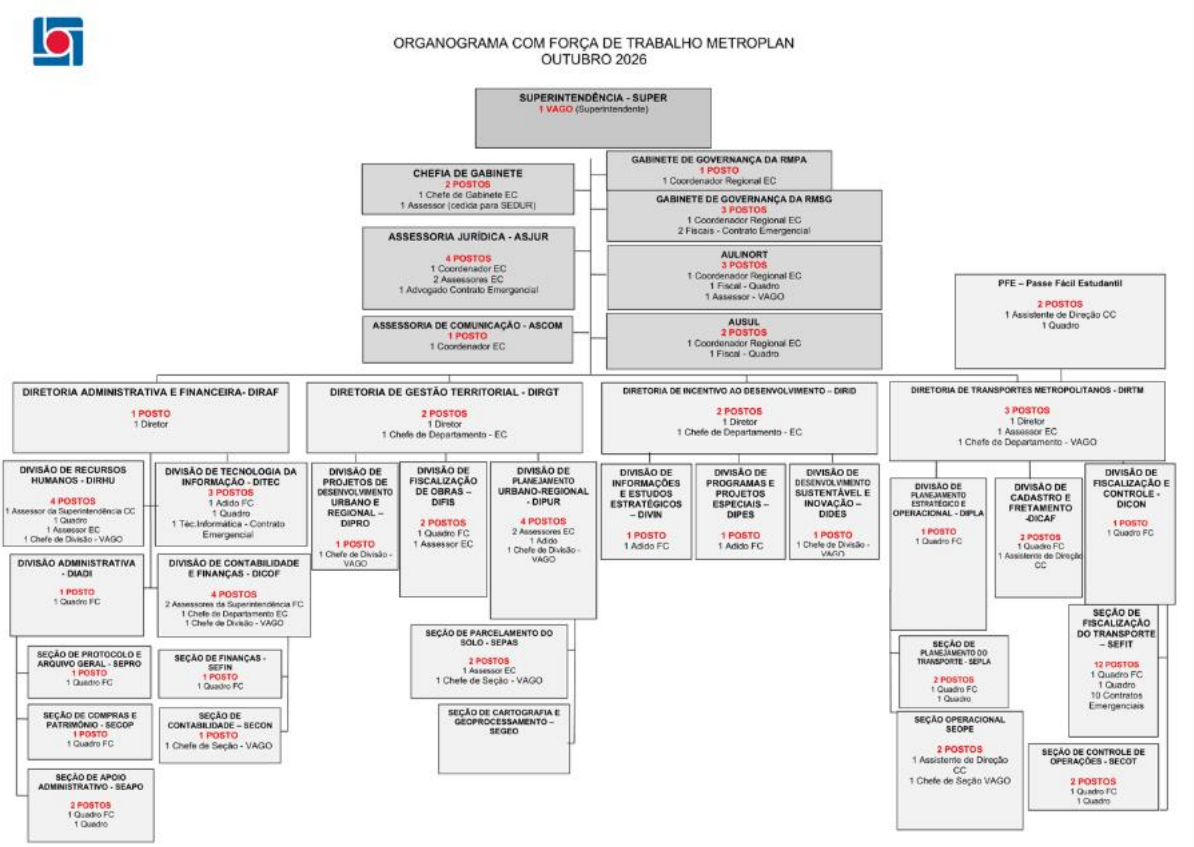

Programas, resultados e agenda de continuidade

1. Passe Fácil Estudantil

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Passe Fácil Estudantil
Base legal	Instituído pela Lei nº 16.363/2025 e regulamentado pelo Decreto nº 58.580/2025.
Unidade responsável	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan.
Objetivo	Programa do governo do Estado que garante apoio ao deslocamento de estudantes de baixa renda até a instituição regular de ensino, tem como objetivo incentivar a formação de estudantes em situação de vulnerabilidade social e ampliar o acesso a cursos considerados estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Justificativa	A iniciativa facilita o acesso à educação para quem mora em um município e estuda em outro, reduzindo custos e simplificando o processo de concessão do benefício. O Passe Fácil Estudantil fortalece a permanência dos estudantes nas instituições de ensino, promove a inclusão social e contribui para o desenvolvimento regional, garantindo que a distância não seja um obstáculo ao direito à educação.
Principais instrumentos	O Passe Fácil Estudantil abrange: Sistema Metropolitano (SETM): subsídio de 100% da tarifa em linhas comuns das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. Fora do SETM (Interior): auxílio financeiro para custear o transporte entre o município de residência e o local de estudo, inclusive em deslocamentos interestaduais. Transporte hidroviário: possibilidade de utilização em linhas seletivas, quando não houver oferta de linhas comuns.
Público-alvo e abrangência	Estudantes em situação de vulnerabilidade social.
Beneficiários diretos	Estudantes beneficiários do programa, promovendo melhores condições de acesso e permanência nas instituições de ensino e contribuindo para a formação de profissionais em cursos considerados estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O Programa Passe Fácil Estudantil constitui uma importante política pública de apoio ao acesso e à permanência dos estudantes no sistema de ensino, promovendo condições para o deslocamento entre o município de residência e a instituição de ensino. Ao longo do período

analisado, o programa beneficiou 199.033 estudantes, demonstrando sua relevância social e seu alcance em diferentes regiões do Estado.

A distribuição dos beneficiários evidencia a concentração da demanda na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com 104.910 estudantes atendidos, correspondendo à maior parcela dos beneficiários do programa. A Região Interior aparece em seguida, com 57.360 estudantes beneficiados, reforçando a importância da política pública para alunos que realizam deslocamentos intermunicipais em áreas não abrangidas pelo Sistema Estadual de Transporte Metropolitano (SETM). As demais regiões atendidas, incluindo a Aglomeração Urbana do Litoral Norte (AULIN), a Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG) e a Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL), também apresentam participação relevante, demonstrando a abrangência territorial do programa.

Os resultados evidenciam a consolidação do Passe Fácil Estudantil como instrumento de inclusão e mobilidade estudantil, contribuindo para a redução dos custos de deslocamento e para a permanência de milhares de estudantes em suas atividades acadêmicas. Os dados mais recentes confirmam a continuidade da demanda pelo benefício e reforçam a necessidade de manutenção e aprimoramento desta política pública, que desempenha papel fundamental no acesso à educação em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

AGENDA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Etapa atual	Status: [ ] em planejamento [ ] em contratação [**X**] em execução [ ] encerramento No contexto da execução do programa, encontra-se em andamento o Edital nº 004/2026, que visa convocar estudantes matriculados em instituições regulares de ensino localizadas em município diverso do de sua residência, em áreas não abrangidas pelo Sistema Estadual de Transporte Metropolitano (SETM), para realização de novas inscrições e renovação semestral do benefício referente ao período letivo de 2026/2. As atividades atualmente em execução compreendem o período de inscrições e renovações, o recebimento e envio da documentação pelos estudantes, o encerramento dos prazos estabelecidos no edital, a análise e validação documental pelas equipes técnicas, o processamento dos pedidos habilitados e o cálculo individual dos benefícios a serem concedidos. Na sequência, são gerados os arquivos para processamento bancário e pagamento dos auxílios, bem como os arquivos destinados à instituição financeira responsável pela operacionalização do programa. Após essa etapa, cabe ao Banrisul a produção dos cartões dos estudantes contemplados, seguida da distribuição e envio dos cartões para as respectivas agências bancárias, possibilitando sua retirada pelos beneficiários e a efetiva utilização do benefício. Descrição da etapa: O Programa Passe Fácil Estudantil encontra-se em execução contínua, atendendo estudantes da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), da Aglomeração

	Urbana do Litoral Norte (AULIN), da Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), da Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL) e da Região Interior, áreas abrangidas pela atuação da METROPLAN. O processamento das solicitações é realizado por meio do Sistema SIMET, contemplando as etapas de análise cadastral, validação documental, concessão do benefício e monitoramento dos indicadores de atendimento. Por se tratar de uma política pública permanente e de caráter continuado, a execução do programa deverá permanecer ativa durante todo o processo de transição governamental, sem previsão de encerramento, assegurando a conclusão das etapas previstas no Edital nº 004/2026 e a continuidade do atendimento aos estudantes beneficiários.
Próxima etapa	Descrição da próxima etapa: Nos primeiros 100 dias da nova gestão, a principal etapa será a operacionalização do processo de renovação e concessão de novos benefícios para o ano letivo de 2027, garantindo a continuidade do atendimento aos estudantes das regiões abrangidas pelo Programa Passe Fácil Estudantil. As atividades compreenderão a divulgação dos cronogramas e orientações aos usuários, o recebimento e a análise das solicitações, a validação cadastral e documental por meio do Sistema SIMET, o processamento das concessões e o acompanhamento dos indicadores de atendimento. O cronograma deverá ser concentrado entre janeiro e abril de 2027, período em que tradicionalmente ocorre o maior volume de solicitações em razão do início do ano letivo. Paralelamente, será necessário manter o monitoramento da execução física e financeira do programa, bem como a atualização dos procedimentos operacionais e dos instrumentos de comunicação com estudantes, instituições de ensino e operadores de transporte. A continuidade dessas ações é essencial para assegurar a manutenção do benefício, evitar interrupções no atendimento e garantir o acesso dos estudantes ao transporte coletivo para deslocamento às instituições de ensino.
Orçamento	**Orçamento dotação com alteração 2026:** 21.723.619,00 **Orçamento empenhado até ago/2026**: 5.446.328,79 **Orçamento liquidado até ago/2026**: 5.446.328,79 **Orçamento LOA 2027:** orçado pela SEDUR **Fonte do recurso:** Recurso do Tesouro – 0001 Importante observar que, devido ao fato de boa parte do valor do PLE Bilhetagem estar em fase de compensação das antecipações de 2020 a 2023 e 2025, não se tem utilizado o valor orçado, e que nos exercícios anteriores este valor foi utilizado para antecipação do PLE para as empresas.
Pontos críticos e riscos	Nos primeiros 100 dias da nova gestão, será fundamental assegurar a continuidade operacional do Programa Passe

	Fácil Estudantil, especialmente em razão do período de maior demanda associado ao início do ano letivo de 2027. As principais decisões necessárias envolvem a manutenção da estrutura de atendimento, a disponibilidade do Sistema SIMET para processamento das solicitações e a garantia dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução do programa. Entre os riscos relevantes destacam-se o aumento do volume de solicitações de novos benefícios e renovações, eventuais atrasos na análise e validação documental. Também merece atenção o acompanhamento dos contratos e serviços de terceiros, a atualização de normativos e procedimentos operacionais, quando necessária, e a adoção de estratégias de comunicação para orientar estudantes e instituições de ensino quanto aos prazos e requisitos do programa, minimizando inconsistências cadastrais e retrabalho durante o período de maior procura.
Recomendações	Recomenda-se a manutenção e o fortalecimento do Programa Passe Fácil Estudantil como política pública permanente de apoio ao acesso e à permanência dos estudantes no sistema de ensino. Para tanto, sugere-se o aperfeiçoamento contínuo dos processos de análise e concessão do benefício, com ampliação da automação das validações realizadas pelo Sistema SIMET. Outra ação relevante é o fortalecimento da comunicação com estudantes, instituições de ensino, operadores de transporte e demais parceiros envolvidos, por meio de orientações claras, divulgação antecipada dos cronogramas e disponibilização de materiais de apoio. Adicionalmente, recomenda-se avaliar oportunidades de simplificação documental e de ampliação da digitalização dos processos, visando maior agilidade, transparência e qualidade no atendimento aos beneficiários.
Mais informações	Site Metroplan – http://www.metroplan.rs.gov.br/ Acesso PFE – https://passefacil.rs.gov.br/

2. Fretamento Legal

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO	
Nome	Fretamento Legal

Base legal	Lei N° 11.127/98. Decreto N° 39.185/98. Decreto 57.789/24 - Inscrição Estadual para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Resolução CETM N° 083 - Laudo de Inspeção Técnica Veicular. Resolução CETM N° 090 - Altera a Resolução Nº 083 CETM. Resolução CETM N° 095 - Fretamento de Pacientes para tratamento de saúde e familiares em visitação a detentos. Resolução CETM Nº 096 - Penalidades a serem aplicadas às empresas operadoras, permissionárias, concessionárias e autorizatárias. Resolução CETM N° 097 - Altera a Resolução Nº 095 CETM. Resolução CETM Nº 111 - Fretamento Contínuo Hidroviário de Funcionários e Fretamento Eventual Hidroviário. Resolução CETM N° 126 - Fretamento Contínuo e Eventual. Resolução CETM Nº 127 - Fretamento Contínuo por Empresas Concessionárias. Resolução CETM Nº 130 - Altera a Resolução Nº 111 do CETM. Ordem de Serviço Nº 002 – 2013. Ordem de Serviço Nº 003 – 2013. Ordem de Serviço Nº 004 – 2015. Ordem de Serviço Nº 001 – 2021. Ordem de Serviço Nº 002 – 2021.
Unidade responsável	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan
Objetivo	Possibilitar que o usuário do transporte de fretamento possa consultar a legalidade do veículo em tempo real e otimizar o procedimento de fiscalização por parte dos fiscais de transporte, proporcionando uma maior agilidade (eliminação do porte de documentos - autorização de fretamento e lista de passageiros). Obs.: Projeto já implantado (em operação).

Justificativa	O Fretamento Legal facilita o controle do transporte de fretamento tanto pela sociedade como pelo poder concedente. O projeto desburocratiza os procedimentos de obtenção da autorização de fretamento e torna mais ágil a operação de fiscalização dos fiscais de transporte.
Principais instrumentos	Selo adesivo com código de barras no padrão QR CODE emitido pela METROPLAN, único por veículo, disponibilizado juntamente com a Autorização para Viagens Especiais de Fretamento Contínuo. Adesivagem obrigatória no veículo cadastrado, dentro da conformidade estabelecida, com responsabilidade do transportador de manter visível em local determinado pela METROPLAN e legível, que neste caso dispensa a obrigatoriedade de porte obrigatório dos demais documentos no veículo. Portal do Fretamento - novo procedimento para solicitação de agendamento e análise da documentação (Fretamento Contínuo).
Público-alvo e abrangência	Empresas de Transporte / usuários do Transporte de Fretamento. Projeto contempla as regiões de competência da Metroplan: Região Metropolitana de Porto Alegre, Região Metropolitana da Serra Gaúcha, Aglomeração Urbana do Litoral Norte e Aglomeração Urbana Sul.
Beneficiários diretos	Empresas de Transporte, usuários do Transporte de Fretamento e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

RESULTADOS E ENTREGAS DO PROGRAMA, PROJETO OU AÇÃO

O Projeto Fretamento Legal possibilitou o aumento no número de veículos / empresas de transporte cadastradas no Fretamento da Metroplan. Além disso, com a implantação do projeto foi possível otimizar o processo de agendamento e análise da documentação das empresas de transporte gerando ganho de tempo entre a tarefa de solicitação de agendamento até a expedição da autorização de fretamento. Na fiscalização o efeito foi imediato com o ganho de agilidade na atividade de blitz (QR CODE). Status do Projeto em execução.

Nos primeiros 100 dias da nova gestão, será fundamental assegurar a continuidade operacional do programa, bem como garantir a atualização e implementação do Portal do Fretamento (contínuo e eventual) que estão em construção.

FRETAMENTO - Serviços e Lugares - Setembro 2026

Diretoria de Transportes Metropolitanos | Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

1. RESUMO GERAL

Contratos	Lugares ofertados	Lugares em lista de passageiros
727	60.325	83.375

Diferença entre lista e oferta: **+23.050** lugares

2. COMPARATIVO POR REGIÃO

Região	Contratos	Lugares ofertados	Lugares em lista de passageiros	Diferença (lista - oferta)
RMPA	469	45.058	50.614	+5.556
RMSG	193	12.524	11.537	-987
AULINOR	40	1.264	999	-265
AUSUL	25	1.479	20.225	+18.746
TOTAL	727	60.325	83.375	+23.050

3. DETALHAMENTO CONSOLIDADO POR TIPO DE SERVIÇO

Tipo de serviço	Contratos	Lugares ofertados	Lugares em lista
Funcionários	402	52.857	54.734
Escolar	223	5.271	27.410
Grupo de pessoas físicas com vínculo empregatício comum	8	32	104
Empresas privadas que transportam seus funcionários em veículo próprio	20	393	1.120
Pacientes para tratamento de saúde	73	1.757	7
Familiares em visitação a detentos	1	15	0
TOTAL	727	60.325	83.375

4. DETALHAMENTO POR REGIÃO E TIPO DE SERVIÇO

RMPA

Tipo de serviço	Contratos	Ofertados	Em lista
Funcionários	224	40.425	43.994
Escolar	157	3.130	5.544
Grupo de pessoas físicas com vínculo empregatício comum	7	32	72
Empresas privadas em veículo próprio	16	304	997
Pacientes para tratamento de saúde	64	1.152	7
Familiares em visitação a detentos	1	15	0
TOTAL	469	45.058	50.614

RMSG

Tipo de serviço	Contratos	Ofertados	Em lista
Funcionários	155	11.170	9.559
Escolar	31	720	1.870
Empresas privadas em veículo próprio	3	89	108
Pacientes para tratamento de saúde	4	545	0
TOTAL	193	12.524	11.537

AULINOR

Tipo de serviço	Contratos	Ofertados	Em lista
Funcionários	7	593	421
Escolar	28	611	578
Pacientes para tratamento de saúde	5	60	0
TOTAL	40	1.264	999

AUSUL

Tipo de serviço	Contratos	Ofertados	Em lista
Funcionários	16	669	760
Escolar	7	810	19.418
Grupo de pessoas físicas com vínculo empregatício comum	1	0	32
Empresas privadas em veículo próprio	1	0	15
TOTAL	25	1.479	20.225

Fonte: Diretoria de Transportes Metropolitanos / Metroplan — Relatório Serviço Lugares, setembro de 2026.

METROPLAN

DICAF | Fretamento Gerencial 2026

1º e 2º quadrimestres — janeiro a abril e maio a agosto

Evolução mensal dos relatórios gerenciais da Divisão de Cadastro e Fretamento (DICAF) da Metroplan.

Junho estimado por média entre maio e julho, devido a falha no sistema.

Veículos Cadastrados por mês



Médias por quadrimestre

1º quadrimestre — média mensal		2º quadrimestre — média mensal	
Empresas	333	Empresas	334
Contratos	493	Contratos	660
Veículos Regulares	1.739	Veículos Regulares	2.018
Veículos c/ Pendência	638	Veículos c/ Pendência	440
Veículos Cadastrados	2.376	Veículos Cadastrados	2.457

Inclui o mês de junho estimado (Jun*).

Contratos por mês



Veículos Regulares por mês



Empresas por mês



Veículos c/ Pendência por mês



Variação média entre quadrimestres

Comparação do 2º quadrimestre em relação ao 1º quadrimestre.

Empresas	Contratos	Veículos Regulares	Veículos c/ Pendência	Veículos Cadastrados
+0,4%	+33,8%	+16,1%	-31,1%	+3,4%

Dados mensais — DICAF 2026

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun*	Jul	Ago
Empresas	342	338	323	327	330	332	334	339
Contratos	459	449	506	558	607	642	676	714
Veículos Regulares	1.790	1.741	1.753	1.670	1.908	2.015	2.121	2.028
Veículos c/ Pendência	635	632	605	678	501	427	352	478
Veículos Cadastrados	2.425	2.373	2.358	2.348	2.409	2.441	2.473	2.506

Junho estimado

Empresas	332
Contratos	642
Veículos Regulares	2.015
Veículos c/ Pendência	427
Veículos Cadastrados	2.441

Estimativa calculada pela média entre maio e julho.

Junho estimado por média entre maio e julho, devido a falha no sistema.

Fonte: relatórios gerenciais de fretamento — DICAF / Metroplan, jan-ago de 2026.
*Junho estimado por média entre maio e julho.

METROPLAN 50 ANOS

Encerramento

Este **Livro** encerra o registro do ciclo de gestão 2023–2026 e reúne informações destinadas a preservar a memória institucional e contribuir para a continuidade administrativa do Estado.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul | Gestão 2023–2026

Governador | Eduardo Leite **- Vice-governador** | Gabriel Souza

1. **Casa Civil** | Ranolfo Vieira Júnior
2. **Casa Militar** | Cel. Luciano Chaves Boeira
3. **Procuradoria-Geral do Estado** | Eduardo Cunha da Costa
4. **Sec. da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação** | Márcio Madalena
5. **Secretaria de Comunicação** | Caio Tomazeli
6. **Secretaria da Cultura** | André José Kryszczun
7. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico** | Leandro Evaldt
8. **Secretaria de Desenvolvimento Rural** | Gustavo Paim
9. **Secretaria de Desenvolvimento Social** | Gustavo Segabinazzi Saldanha
10. **Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano** | Davi Severgnini
11. **Secretaria da Educação** | Stefanie Eskereski
12. **Secretaria do Esporte e Lazer** | Joel Maraschin
13. **Secretaria da Fazenda** | Pricilla Maria Santana
14. **Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária** | Bruno Silveira
15. **Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia** | Lisiane Lemos
16. **Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos** | Fabricio Guazzelli Peruchin
17. **Secretaria de Logística e Transportes** | Clóvis Garcez Magalhães
18. **Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura** | Isa Carla Osterkamp
19. **Secretaria da Mulher** | Ana Costa
20. **Secretaria de Obras Públicas** | Izabel Matte
21. **Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão** | Danielle Calazans
22. **Secretaria da Reconstrução Gaúcha** | Pedro Capeluppi
23. **Secretaria da Saúde** | Arita Bergmann
24. **Secretaria da Segurança Pública** | Mário Yukio Ikeda
25. **Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo** | Cesar Rossato
26. **Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional** | José Scorsatto
27. **Secretaria de Turismo** | Raphael Ayub
28. **Secretaria Extraordinária Geral de Governo** | Artur Lemos
29. **Secretaria Executiva Particular do Governador** | Ester Rodrigues
30. **Chefia de Gabinete do Governador** | Euclides Maria da Silva Neto

Coordenação do material
Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG

subsecretariadeplanejamento@spgg.rs.gov.br

- **Projeto gráfico e diagramação**
Assessoria de Comunicação – ASCOM
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG
